



LIBRO DE OBRA No. 001



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☒ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: CHARLA DE SEGURIDAD E INICIO DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

04/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta
RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 002



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: EXCAVACIONES

PERSONAL UTILIZADO	EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1)	1.- Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)	2.-
3.-Maestro mayor (1)	3.-
4.-Obreros(3)	4.-
5.-	5.-

VISITANTES	CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-	Soleado	8 Horas
2.-		
3.-		

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Continuacion de excavaciones de plintos y riostras en los ejes #9A,9B,9C.

2.-Demolicion de tramo de contrapiso para la ampliacion del cuarto de control.

3.-Trazado de terreno para excavacion de trinchera tipo B4 (Según plano)

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
05/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 002



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

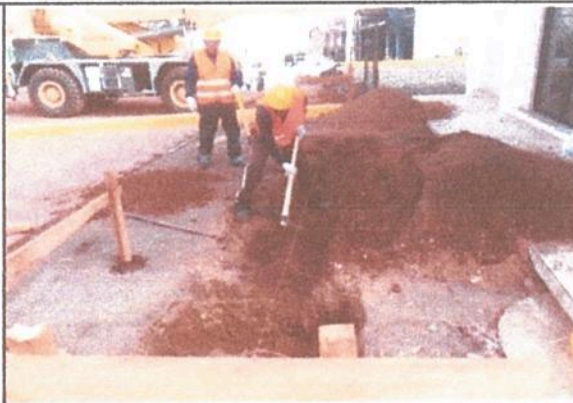
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: EXCAVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





2017/12/05

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 003		
"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO:TRAZADO Y EXCAVACION			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros(3)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Soleado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1. Inicio de trazado para excavacion para banco de ductos de 10x6"(según plano).			
2.-Retiro de grava del area para la excavacion de trinchera tipo B4 (Según plano).			
3.-Demolicion de contra piso para excavacion de riostra en diagonal en el eje 8 y 9B (según plano).			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
06/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nikolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 003



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☐ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: TRAZADO Y EXCAVACION

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





06/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 004		
"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: COMPACTACION DE TERRENO			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- Compactador	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros(3)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Kevin Cruz		Nublado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Modificación del recorrido para banco de ductos de 10x6" solicitada por el Ing. Kevin Cruz.			
2.-Picada de hormigon armado para anclaje de riostras nuevas en el eje # 8A (según plano).			
3.-Corte y configuracion de hierro para plintos y columnas en los ejes #9A, 9B,9C.(según plano)			
4.-Compactacion de terreno para plintos en los ejes #9A, 9B,9C(según plano).			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.		Por el CONTRATISTA
07/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR		 NOMBRE:Arq. Nicolas Parrita RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 004



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐





ASUNTO: COMPACTACION DE TERRENO

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
07/12/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Paraita RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 005		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: FUNDICION DE REPLANTILLO			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Concretera	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros(3)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Soleado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Se continua con el picado de hormigon de columnas antiguas para anclaje de riostras nuevas en el eje # 8C			
2.-Fundicion de replantillos para plintos en los ejes #9A, 9B,9C (según el plano), (hormigon simple).			
3.-Fundicion de cimientos tramos en los ejes # 9A,9B,9C (según el plano), (hormigon simple).			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.		Por el CONTRATISTA
08/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR		 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 005



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: FUNDICION DE REPLANTILLO

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha





Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

08/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta
RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 006		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Concretera	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
4.-Obreros (3)		4.-	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Jinmy Zambrano		Soleado	5 Horas
2.-Ing. Fernando Viteri			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Inicio de excavacion de terreno para trinchera tipo B4 (según plano) con retroexcavadora.			
2.-Fundicion de plintos en los ejes # 9A,9B,9C. según el plano			
3.-			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-El Ing. Mario Castro De Seguridad solicita a Fiscalizacion Ing. Jose Castro solicite a ELEGALAPAGOS provea de planos electricos para la continuacion de excavacion de trinchera debido a la presencia de cables, para evitar accidentes laborales.			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
2017/12/09	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 006



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐





ASUNTO: INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
2017/12/09	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 007		
"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (5)		4.-	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Nublado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.- Continuación de excavación de trinchera tipo B4 con retroexcavadora			
2.-Corte y configuración de hierro para riostras			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
11/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 007



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: EXCAVACION

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





11/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Paraita

RESIDENTE DE OBRA

	<p align="center">LIBRO DE OBRA No. 008</p> <p align="center">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>		
<p align="center">CONTRATO N° 005-2017</p>			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION Y ENCOFRADO DE RIOSTRAS			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (5)		4.-	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Nublado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Continuacion de excavacion de trinchera tipo B4 con retroexcavadora.			
2.-Armado e inicio de encofrado de riostras en ejes: #9; #8A-9A; #8B-9B.			
3.-Picado de ceramica de acera exterior del cuarto de control.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
12/12/2017	<div align="center">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>	<div align="center">  NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA </div>	



LIBRO DE OBRA No. 008



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐





ASUNTO: EXCAVACION Y ENCOFRADO DE RIOSTRAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
12/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 009		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION Y ENCOFRADO DE RIOSTRAS			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (5)		4.-Vibrador	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Nublado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Continuacion de excavacion de trinchera tipo B4 con retroexcavadora.			
2.-Finalizacion de encofrado de riostras en ejes: #9; #8A-9A; #8B-9B.			
3.- Finalizacion de picado de ceramica de acera exterior del cuarto de control.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-Se recomienda que se proceda con la construccion de la cercha para poder continuar con los rubros que tienen incidencia.			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
13/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 009



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



ELECTRICA



ELECTRONICA







ASUNTO: EXCAVACION Y ENCOFRADO DE RIOSTRAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
13/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 010		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (5)		4.-Vibrador	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.- Ing Rafael Bastidas		Nublado	8 Horas
2.-Ing Jimmy Zambrano			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Continuacion de excavacion de trinchera tipo B4 con retroexcavadora.			
2.-Desalojo de material excavado a estoqueo.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.- Se presenta a fiscalizacion el Informe de dosificación para hormigones			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
14/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolás Peralta RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 010



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ECTRONICA

ASUNTO: INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA



14/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

	<h1 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h1> <h2 style="text-align: center;">No. 011</h2>		
<p style="text-align: center;">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>			
<h3 style="text-align: center;">CONTRATO N° 005-2017</h3>			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (5)		4.-Vibrador	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Nublado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion para banco de ductos 6x6" con retroexcavadora.			
2.-Desalojo de material excavado a estoqueo.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Se insiste en el pedido de la entrega del presupuesto de la ampliacion de la caseta con los precios			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
15/12/2017	NOMBRE: Ing. Jose Castro	NOMBRE: Arq. Nicolas Paraita	
	FISCALIZADOR	RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 011



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

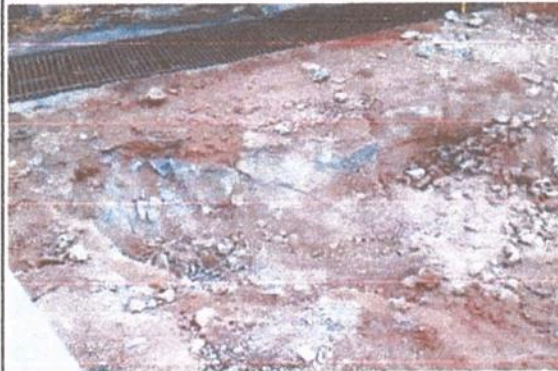
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐





ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
15/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arg. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

	<p align="center">LIBRO DE OBRA No. 012</p> <p align="center">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>		
<p align="center">CONTRATO N° 005-2017</p>			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (5)		4.-Vibrador	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Nublado	5 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.			
2.-Desalojo de material excavado a estoqueo.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
16/12/2017	<div align="center">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>	<div align="center">  NOMBRE: Arg. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA </div>	



LIBRO DE OBRA No. 012



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐



ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
16/12/2017	<div>NOMBRE: Ing. Jose Castro</div> <div>FISCALIZADOR</div>	<div>NOMBRE: Arg. Nicolas Peralta</div> <div>RESIDENTE DE OBRA</div>

	LIBRO DE OBRA No. 013		
"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input type="checkbox"/> ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (5)		4.-Vibrador	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Nublado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.			
2.-Desalojo de material excavado a estoqueo.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Lugar y Fecha			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
18/12/2017	NOMBRE: Ing. Jose Castro	NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta	
	FISCALIZADOR	RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 013



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





18/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

	<p align="center">LIBRO DE OBRA No. 014</p> <p align="center">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>		
<p align="center">CONTRATO N° 005-2017</p>			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION Y FUNDICION DE RIOSTRAS			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concreteira	
4.-Obreros (5)		4.-Vibrador	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Nublado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.			
2.-Retiro de grava para excavacion de banco de ductos de 6x6" (según plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro electrico			
3.-Desalojo de material excavado a estoqueo.			
4.-Fundicion de riostras en ejes: #9; #8A-9A; #8B-9B. Con hormigon de 210 kg/cm2.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-Se tomo muestras de hormigon en cilindros para su posterior rotura y verificacion de su resistencia.			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
19/12/2017	<div align="center">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>	<div align="center">  NOMBRE: Arg. Nicolás Peralta RESIDENTE DE OBRA </div>	



LIBRO DE OBRA No. 014



AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ELECTRONICA

ASUNTO: EXCAVACION Y FUNDICION DE RIOSTRAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





19/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 015		
	<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION Y FUNDICION DE COLUMNAS			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (5)		4.-Vibrador	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Nublado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.			
2.-Excavacion manual para de banco de ductos de 6x6" (según plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro eléctrico.			
3.- Desencofrado de riostras. Encofrado de columnas en el eje # 9A,9C (según plano).			
4.-Fundicion de columnas en el eje # 9A,9C (según el plano).			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.		Por el CONTRATISTA
20/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR		 NOMBRE:Arg. Nicolás Peralta RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 015



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐



ASUNTO: EXCAVACION Y FUNDICION DE COLUMNAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
20/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arg. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 016		
"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input type="checkbox"/> ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO:EXCAVACION, FUNDICION DE COLUMNA Y DESALOJO DE MATERIAL			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (4)		4.-Vibrador	
5.-Operador (1)		5.-Andamios	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Lourdes Rodriguez		Nublado	8 Horas
2.-Ing. Jimmy Zambrano			
3.-Ing. Luis Ugsha			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.			
2.-Excavacion manual para de banco de ductos de 6x6" (según plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro electrico.			
3.-Encofrado y fundicion de columna en el eje # 9B (según el plano).			
4.-Desalojo de material excavado.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
21/12/2017	NOMBRE: Ing. Jose Castro	NOMBRE:Arg. Nicolas Peralta	
	FISCALIZADOR	RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 016



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ECTRONICA

☐

ASUNTO: EXCAVACION, FUNDICION DE COLUMNA Y DESALOJO DE MATERIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





21/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arg. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 017		
"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input type="checkbox"/> ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACIONES Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Andamios	
4.-Obreros (5)		4.-	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing.Jimmy Zambrano		Soleado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.			
2.-Excavacion manual para de banco de ductos de 6x6" (según plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro electrico.			
3.-Colocacion de mamposteria en el eje #8C,9C (Según plano)			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
22/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 017



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐





ASUNTO: EXCAVACIONES Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
22/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arg. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 018 <small>*AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA*</small>	
CONTRATO N° 005-2017		
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input type="checkbox"/> ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>
ASUNTO: EXCAVACIONES, COLOCACION DE MAMPOSTERIA Y CONSTRUCCION DE CASETA PARA MATERIALES		
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.- Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor
2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- Retroexcavadora (martillo y cucharón)
3.- Maestro mayor (1)		3.- Andamios
4.- Obreros (4)		4.-
5.- Operador (1)		5.-
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS
1.-		Nublado
2.-		
3.-		
		4 Horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:		
1.- Excavación en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.		
2.- Excavación manual para de banco de ductos de 6x6" (según plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de control eléctrico.		
3.- Colocación de mampostería en el eje #9B,9C (Según plano).		
4.- Nivelación e inicio de construcción de bodega para materiales.		
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:		
1.-		
2.-		
3.-		
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:		
1.-		
2.-		
3.-		
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
23/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 018



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ECTRONICA

ASUNTO: EXCAVACIONES, COLOCACION DE MAMPOSTERIA Y CONSTRUCCION DE CASETA PARA MATERIALES

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





23/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 019		
"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input type="checkbox"/> ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MATERIALES			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.- Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.- Maestro mayor (1)		3.-	
4.- Obreros (2)		4.-	
5.- Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Nublado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.- Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.			
2.- Continuacion de la construccion de la bodega para materiales.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.		Por el CONTRATISTA
25/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR		 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 019



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐





ASUNTO: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MATERIALES

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
25/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

	<h1 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h1> <h2 style="text-align: center;">No. 020</h2>		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
<h3>CONTRATO N° 005-2017</h3>			
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION, CONSTRUCCION DE BODEGA, FUNDICION DE VIGUETAS			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.- Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.- Maestro mayor (1)		3.- Concretera	
4.- Obreros (3)		4.- Vibrador	
5.- Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.- Ing. Fernando Viteri		Nublado	8 Horas
2.- Ing. Luis Ugsha			
3.- Ing. Lourdes Rodriguez			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.- Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.			
2.- Finalizacion de la construccion de la bodega para materiales.			
3.- Instalacion de tubo PVC=4" para drenaje de agua lluvia en el eje 9C.			
4.- Corte, configuracion de hierro para viguetas de amare en el eje #9B,9C Y #8C,9C.			
5.- Fundicion de viguetas de amarre en el eje #9B,9C Y #8C,9C.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.- No se puede avanzar rapidamente con la excavacion para el banco de ductos debido a que la constitucion del terreno es 100% rocoso, por esta razon se esta utilizando roto martillo instalado en la retroexcavadora.			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.- se recomienda una vez mas la construccion de la sercha para proceder con el cambio de la cubierta en area de ampliacion de la caseta.			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
26/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 020



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA



☐ ECTRONICA





ASUNTO: EXCAVACION, CONSTRUCCION DE BODEGA, FUNDICION DE VIGUETAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
26/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arg. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

 ELEGALAPAGOS	LIBRO DE OBRA No. 021		
	"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACIONES ,COMPACTACION Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concreteira	
4.-Obreros (3)		4.Compactador	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing Fernando Viteri		Nublado	8 Horas
2.-Ing. Luis Ugsha			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.- Finalizacion de excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.			
2.- Colocacion de mamposteria en los ejes #8A,9A.			
3.- Rasanteo y compactacion de un tramo de terreno para trinchera tipo B4 para replantillo.			
4.-Excavacion para banco de ductos de 4x6" hacia los transformadores.			
5.-Replantillo de un tramo de trinchera tipo B4.			
6.- Estoqueo de material excavado.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.- Se suspende la obra por motivos de fiesta de fin de año.			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
27/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 021



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: EXCAVACIONES ,COMPACTACION Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





27/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Paralta

RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 022		
"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACIONES Y ENCOFRADO DE VIGUETAS			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (4)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Soleado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion para banco de ductos de 4x6 en direccion a las oficinas de ELEGALAPAGOS.			
2.-Finalizacion de excavacion manual para de banco de ductos de 6x6" (según plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro eléctrico.			
3.-Armado y encofrado de pilares entre los ejes #8A, 9A.			
4.Estoque de material excavado.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-No se a presentado la planilla de avance de obra del primer mes.			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
04/01/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 022



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA C.A. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: EXCAVACIONES Y ENCOFRADO DE VIGUETAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

04/01/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 023



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ELECTRONICA

ASUNTO: EXCAVACIONES Y FUNDICION DE PILARETES

PERSONAL UTILIZADO

- 1.-Residente de obra (1)
- 2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)
- 3.-Maestro mayor (1)
- 4.-Obreros (4)
- 5.-

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

- 1.-Herramienta menor
- 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)
- 3.-Concretera
- 4.-Vibrador
- 5.-

VISITANTES

- 1.-Ing. Lourdes Rodriguez
- 2.-Ing. Fernando Viteri
- 3.-

CONDICIONES CLIMATICAS

Soleado

HORAS TRABAJADAS

8 Horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 1.-Finalización de excavación para banco de ductos de 4x6" en dirección a las oficinas de ELEGALAPAGOS.
- 2.-Conexión de tubería de desagüe de aguas lluvias al pozo.
- 3.-Fundición de pilares entre los ejes #8A, 9A.
- 4.-Encofrado de un tramo de trinchera tipo B4 para fundición de muro de piedra
- 5.-Corte y configuración de hierro para banco de ductos de 4x6".

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

Lugar y Fecha

05/01/2018

Por ELEGALAPAGOS S.A.

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

Por el CONTRATISTA

NOMBRE: Arg. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 023



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

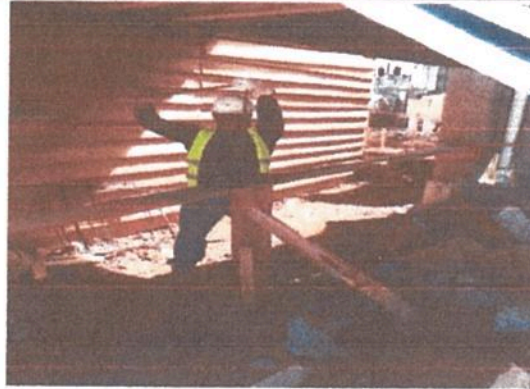
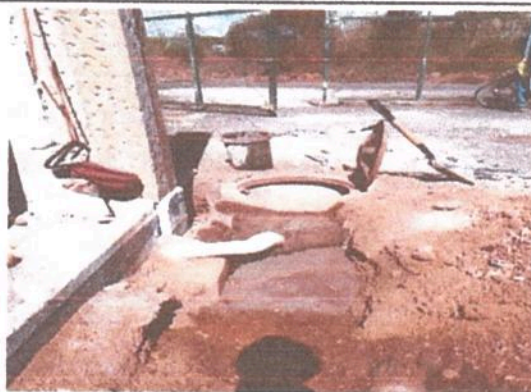
CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ELECTRONICA

ASUNTO: EXCAVACIONES Y FUNDICION DE PILARETES

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





05/01/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

	<h1 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h1> <h2 style="text-align: center;">No. 024</h2>		
<p style="text-align: center;">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>			
<h3 style="text-align: center;">CONTRATO N° 005-2017</h3>			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		Civil <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: FUNDICION DE MURO DE PIEDRA, DESALOJO DE MATERIAL EXCAVADO			
PERSONAL UTILIZADO 1.-Residente de obra (1) 2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 3.-Maestro mayor (1) 4.-Obreros (4) 5.-Operador (1)		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO 1.-Herramienta menor 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón) 3.-Concreteira 4.-Vibrador 5.-	
VISITANTES 1.- 2.- 3.-		CONDICIONES CLIMATICAS <div style="text-align: center;">Soleado</div>	HORAS TRABAJADAS <div style="text-align: center;">4 Horas</div>
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Corte y configuracion de hierro para banco de ductos de 4x6".			
2.-Fundicion de un tramo de muro de piedra en trinchera tipo B4 .			
3.- Desalojo de material excavado.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
06/01/2018	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Arq. Nicolas Paralta RESIDENTE DE OBRA </div>	



LIBRO DE OBRA No. 024



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐



ASUNTO: FUNDICION DE MURO DE PIEDRA, DESALOJO DE MATERIAL EXCAVADO

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
06/01/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

	<h1 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h1> <h2 style="text-align: center;">No. 025</h2>		
<p style="text-align: center;">*AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA*</p>			
<h3 style="text-align: center;">CONTRATO N° 005-2017</h3>			
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		Civil <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: ENCOFRADO DE MURO DE PIEDRA, CORTE DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Cortadora de hormigon	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (4)		4.-Vibrador	
		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Fernando Viteri		Nublado	8 Horas
2.-Ing. Luis Ugsha			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.- Desencofrado de un tramo de muro de piedra en trinchera tipo B4 .			
2.-Encofrado y fundicion de un tramo de muro de piedra en trinchera tipo B4 .			
3.-Trazado y corte de ceramica en el cuarto de control con máquina cortadora.			
4.- Construccion de base para motor de aire acondicionado del cuarto de control			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
08/01/2018	NOMBRE: Ing. Jose Castro	NOMBRE: Arg. Nicolas Peralta	
	FISCALIZADOR	RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 025



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: ENCOFRADO DE MURO DE PIEDRA, CORTE DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





08/01/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

	<h1 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h1> <h2 style="text-align: center;">No. 026</h2>		
<p style="text-align: center;">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>			
<h3 style="text-align: center;">CONTRATO N° 005-2017</h3>			
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: DESENCOFRADO DE MURO DE PIEDRA, RETIRO DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (7)		4.-	
		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Fernando Viteri		Soleado	8 Horas
2.-Ing. Kevin Cruz			
3.-Ing. Jimmy Zambrano			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Desencofrado de un tramo de muro de piedra en trinchera tipo B4 .			
2.-Inicio de retiro de ceramica dentro cuarto de control			
3.-Rasanteo de cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS			
4.-Armado de vigas entre los ejes #9A,9B,9C.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
09/01/2018	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA </div>	



LIBRO DE OBRA No. 026



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: DESENCOFRADO DE MURO DE PIEDRA, RETIRO DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA



09/01/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 027		
<small>*AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA*</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: TRABAJOS EN DUCTOS DE 4X6'			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (7)		4.-	
		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Kevin Cruz		Soleado	8 Horas
2.-Ing. Jimmy Zambrano			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Nivelacion con arena de cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELEGALAPAGOS			
2.-Encofrano para cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELEGALAPAGOS			
3.-Corte y aramado de acero para cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELEGALAPAGOS			
4.- Colocacion de tuberia en banco de ductos con estructura en ductos de 4 x 6"			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.- Ingreso del Ing Jose Wonsang como residente de obra.			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
10/01/2018	NOMBRE: Ing. Jose Castro	NOMBRE: Ing Jose Wonsang	
	FISCALIZADOR	RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 027



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: TRABAJOS EN DUCTOS DE 4X6'

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha





Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

10/01/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang
RESIDENTE DE OBRA

	<p align="center">LIBRO DE OBRA No. 028</p>		
<p align="center">*AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA*</p>			
<p align="center">CONTRATO N° 005-2017</p>			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: TRABAJOS EN DUCTOS DE 4X 6', ROTURA DE CONTRAPISO PARA TRINCHERAS.			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- Rotomartillo	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (7)		4.-	
		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Kevin Cruz		Soleado	8 Horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.Colocacion en terreno de acero de refuerzo de cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELEGALAPAGOS			
2.Colocacion en terreno de tubería para cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELEGALAPAGOS			
3.-Corte y aramado de acero para cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELEGALAPAGOS			
4.- Demolicion de piso para trinchera en el cuarto de control.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.- SE PIDE DE MANERA URGENTE QUE SE AGILITE EL TRABAJO DE CUBIERTA EN CUERTO DE CONTROL.			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
11/01/2018	<div align="center">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>	<div align="center">  NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA </div>	
