



LIBRO DE OBRA No. 051



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

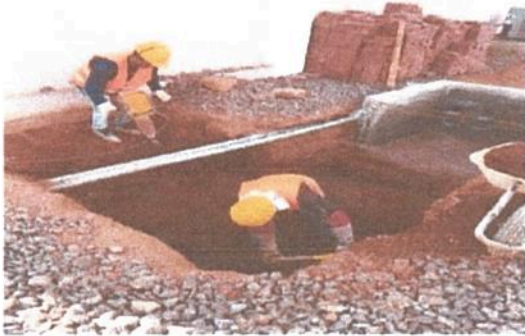
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐





ASUNTO: FUNDICION Y EXCAVACION

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
07/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

 ELEGALAPAGOS	<h2 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h2> <h3 style="text-align: center;">No. 052</h3> <p style="text-align: center; font-size: small;">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION DE TRINCHERA Y FUNDICION DE DUCTOS			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- Rotomartillo	
3.-Maestro mayor (1)		3.- Concretera	
4.-Obreros (6)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Fernando Viteri		Soleado	8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion manual para trincheras interna y externa del cuarto de control.			
2.-Instalacion de ductos y fundicion de ducto de 6x 6" de caja junto a transformador a caja junto a tanques de combustible.			
3.-Instalacion de porcelanato sobre ducto en cuarto de control.			
4.-Nivelacion y relleno de sobreancho de ductos.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
08/02/2018	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Ing. José Castro FISCALIZADOR </div>	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Ing. José Wonsang RESIDENTE DE OBRA </div>	



LIBRO DE OBRA No. 052



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

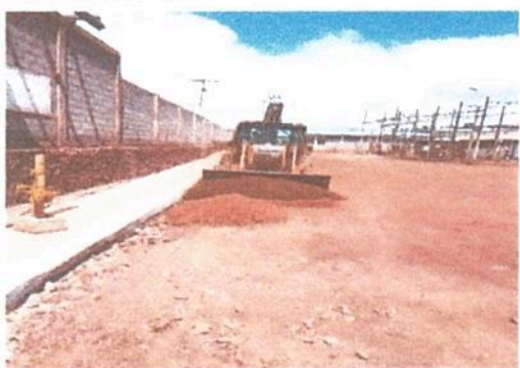
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐



ASUNTO: EXCAVACION DE TRINCHERA Y FUNDICION DE DUCTOS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
08/02/2018	NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 053		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> LECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION MANUAL DE TRINCHERAS INTERNAEN EL CUARTO DE CONTROL			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- Rotomartillo	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (6)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
Soleado		8 horas	
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion manual para trincheras interna y externa del cuarto de control.			
2.-Armado de tapas para cajas.			
3.-Rotura de homigon para trinchera.			
4.-Desalojo de escombros de carpinteria.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
09/02/2018	NOMBRE:Ing. Jose Castro	NOMBRE:Ing. Jose Wonsang	
	FISCALIZADOR	RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 053



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐





ASUNTO: EXCAVACION MANUAL DE TRINCHERAS INTERNAEN EL CUARTO DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
09/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

 <p>ELEGALAPAGOS</p>	<p align="center">LIBRO DE OBRA No. 054</p> <p align="center">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>		
<p align="center">CONTRATO N° 005-2017</p>			
<p>CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.</p>		<p>CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.</p>	
<p>UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS</p>		<p>CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> LECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/></p>	
<p>ASUNTO: Fundicion de caja. Union de ductos con trinchera.</p>			
<p align="center">PERSONAL UTILIZADO</p>		<p align="center">EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO</p>	
<p>1.-Residente de obra (1)</p>		<p>1.-Herramienta menor</p>	
<p>2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)</p>		<p>2.-</p>	
<p>3.-Maestro mayor (1)</p>		<p>3.-</p>	
<p>4.-Obreros (6)</p>		<p>4.-</p>	
<p>5.-</p>		<p>5.-</p>	
<p align="center">VISITANTES</p>		<p align="center">CONDICIONES CLIMATICAS</p>	<p align="center">HORAS TRABAJADAS</p>
		<p align="center">Soleado</p>	<p align="center">4 horas</p>
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS:</p>			
<p>1.-Fundicion de caja. Union de ductos con trinchera.</p>			
<p>2.-Fundicion de tapas para cajas.</p>			
<p>CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:</p>			
<p>1.-</p>			
<p>2.-</p>			
<p>3.-</p>			
<p>INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:</p>			
<p align="center">Lugar y Fecha</p>	<p align="center">Por ELEGALAPAGOS S.A.</p>	<p align="center">Por el CONTRATISTA</p>	
<p align="center">10/02/2018</p>	<p align="center">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </p>	<p align="center">  NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA </p>	



LIBRO DE OBRA No. 054



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



LECTRICA



ECTRONICA







ASUNTO: Fundicion de caja. Union de ductos con trinchera.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
10/02/2018	<p>NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR</p>	<p>NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA</p>

	<h1 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h1> <h2 style="text-align: center;">No. 055</h2>		
<p style="text-align: center;">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>			
<h3 style="text-align: center;">CONTRATO N° 005-2017</h3>			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> LECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (6)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
		Soleado	8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Enlucido en paredes de cuerto de control.			
2.-Desencofrado de cajas.			
3. Movimiento de tierra.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
14/02/2018	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA </div>	



LIBRO DE OBRA No. 055



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

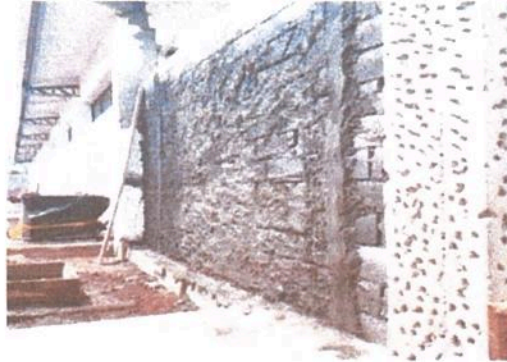
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ LECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐



ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
14/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 056		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (6)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
Soleado		8 horas	
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Enlucido en paredes de cuerto de control.			
2.-Excavacion de trinchera dentro y fuera de la sala de control.			
3. Instalaciones electricas en ampliacion del cuerto de control.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-Las actividades se paralizan debido a los problemas de transporte maritimo para el traslado de material a GALAPAGOS			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
15/02/2018	NOMBRE:Ing. Jose Castro	NOMBRE:Ing. Jose Wonsang	
	FISCALIZADOR	RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 056



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ELECTRONICA

ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





15/02/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 057		
	<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (4)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
		Soleado	8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.			
2.-Armado de encofrado para vigas de cubierta. Cuarto de control			
3.- Instalacion de placas de acero galvanizado de 10mm en cabeza de columnas.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.- Se reinician las actividades de trabajo .			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
03/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 057



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



ELECTRICA



ECTRONICA



ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
03/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 058



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

PERSONAL UTILIZADO	EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)	1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)	2.-	
3.-Maestro mayor (1)	3.-	
4.-Obreros (4)	4.-	
5.-	5.-	
VISITANTES	CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
	Soleado	8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

2.-Armado de encofrado para vigas de cubierta. Cuarto de control

3. Traslado de celdas y accesorios de puerto a obra.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
04/04/2018	 NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 058



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

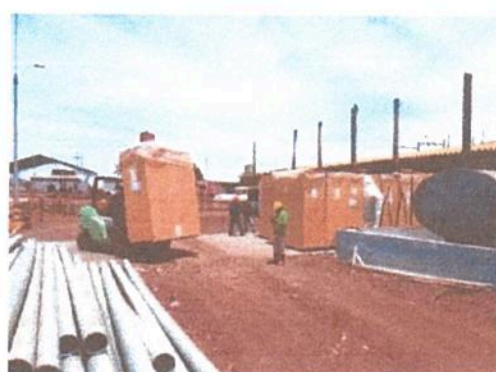
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
04/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wolfang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 057



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.-Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

2.-

3.-Maestro mayor (1)

3.-

4.-Obreros (4)

4.-

5.-

5.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

Soleado

8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

2.-Armado de encofrado para vigas de cubierta. Cuarto de control

3. Instalacion de placas de acero galvanizado de 10mm en cabeza de columnas.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.- Se reinician las actividades de trabajo .

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
03/04/2018	 NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 057



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

03/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 058



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.	CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS	CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

PERSONAL UTILIZADO	EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)	1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)	2.-	
3.-Maestro mayor (1)	3.-	
4.-Obreros (4)	4.-	
5.-	5.-	
VISITANTES	CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
	Soleado	8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:
1.-Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.
2.-Armado de encofrado para vigas de cubierta. Cuarto de control
3. Traslado de celdas y accesorios de puerto a obra.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-
2.-
3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
04/04/2018	 NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 058



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



ELECTRICA

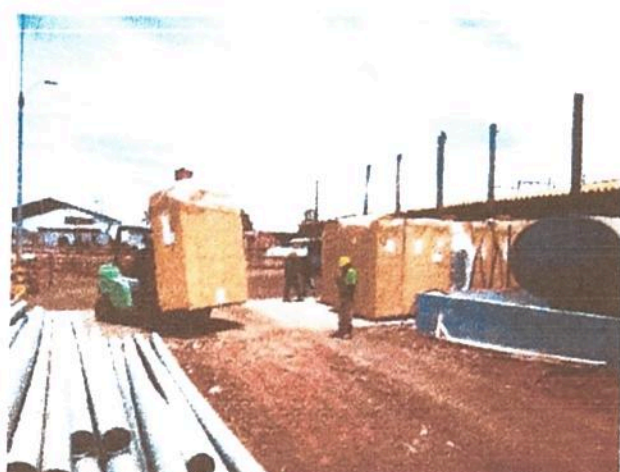
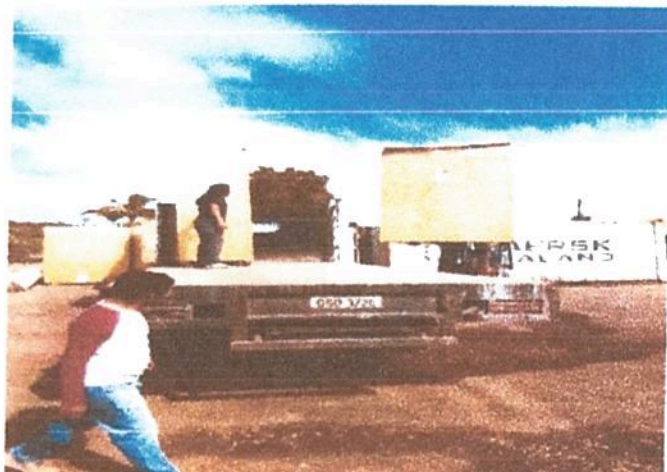


ELECTRONICA



ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

04/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 59

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: <i>ARMADO DE ESTRUCTURA DE VIGAS Y ENCOFRADO</i>			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- <i>HERRAMIENTAS MENOR</i>	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (14)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-			
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1. <i>ARMADO DE ESTRUCTURA PARA VIGAS EN LOS EJES 8A-9A, 9B, 8C, 9C</i>			
2. <i>ARMADO DE ENCOFRADO PARA VIGAS EN EL CUARTO DE AMPLIACIÓN</i>			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
<i>05-04-2018</i>	<i>[Firma]</i> NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	<i>[Firma]</i> NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA

No. 59

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



ELECTRICA



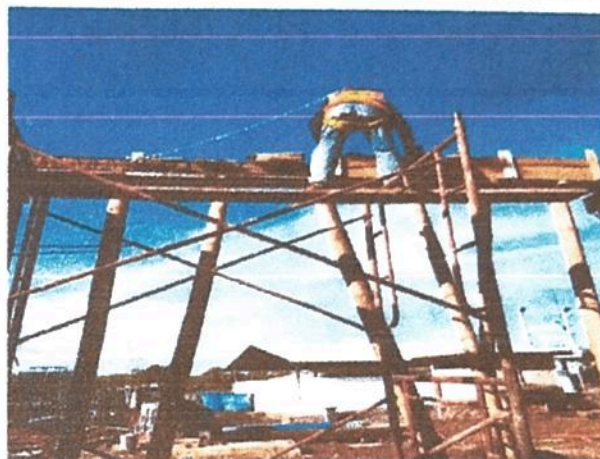
ECTRONICA



ASUNTO:

ACORDO DE ESTRUCTURA DE VIGAS Y ENCUENTRO

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

05/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang
RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 60

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.	CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS	CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>

ASUNTO: *ENCOFADO Y FUNDICIÓN*

PERSONAL UTILIZADO	EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)	1.- HERPESICHTA HENCE	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)	2.- CONCRETA	
3.-Maestro mayor (1)	3.- VIBRADOR	
4.-Obreros (4)	4.-	
5.-	5.-	
VISITANTES	CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-	SOLADO	8 H
2.-		
3.-		

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- *ARMADO DE ESTRUCTURA DE TRINCHERA TIPO B4 (UNDO EXTERIOR)*

2.- *ENCOFADO DE VIGAS PARA CONCRETA EN LOS EJES 8-4A; 4B, 8C y 7C*

3.- *FUNDICIÓN DE VIGAS EN LOS EJES 8A-4A; 4B; 8C-4C*

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-
2.-
3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-
2.-
3.-

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
<i>06-04-2018</i>	<i>[Signature]</i> NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	<i>[Signature]</i> NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 60

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐



ASUNTO: ENCOFRADO Y FUNDICIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
06/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Woreang RESIDENTE DE OBRA

	<h1 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h1> <h2 style="text-align: center;">No. 61</h2>		
<p style="text-align: center;">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>			
<h3 style="text-align: center;">CONTRATO Nº 005-2017</h3>			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: <i>ARMADO DE ESTRUCTURA PARA TRINCHERA</i>			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- <i>HERMIONTA MENOR</i>	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (4)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		<i>SOLEADO</i>	<i>4 HORAS</i>
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
<i>1.- ARMADO DE ESTRUCTURA DE TRINCHERA TIPO 34 (LADO EXTERIOR)</i>			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
<i>07-04-2018</i>	NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	NOMBRE: Ing. Jose Monsang RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 61



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



ELECTRICA



ECTRONICA



ASUNTO: *ARMADO DE ESTRUCTURA PARA TANCHERA*

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

07/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 62



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: ARMADO DE ESTRUCTURAS Y DEMOLICIÓN			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.- Residente de obra (1)		1.- HERRAMIENTA MENOR	
2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- RETROEXCAVADORA	
3.- Maestro mayor (1)		3.-	
4.- Obreros (4)		4.-	
5.- OPERADOR (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		SOLEADO	8 HORAS
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1. ARMADO DE ESTRUCTURA PARA TRINCHERA TIPO B4 (LADO EXTERIOR)			
2. DEMOLICIÓN DE PARED Y COLUMNAS EN EL EJE B DEL CUARTO DE CONTROL PARA AMPLIACIÓN.			
3. ARREGLO DE MALLA DE PUESTA A TIERRA.			
4.-			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
04-04-2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Worsing RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA

No. 62



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: *ARMADO DE ESTRUCTURA Y DEMOLICIÓN*

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

09/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Monsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 63



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: DEMOLICIÓN DE COLUMNAS Y FUNDICIÓN			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.- Residente de obra (1)		1.- HERRAMIENTA MENOR	
2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- RETRAXADORA	
3.- Maestro mayor (1)		3.- CONCRETO	
4.- Obreros (4)		4.- VIBRADOR	
5.- OPERADOR (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		SOLEADO	8 HORAS
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1. DEMOLICIÓN DE PARED, COLUMNA, VIGAS EN EL EJE 8 PARA AMPLIACIÓN DEL CUARTO DE CONTROL.			
2. FUNDICIÓN DE PISO DE TRINCHERA TIPO B4 LADO EXTERIOR.			
3. DESARROLLO DE ENSAYOS DE LA DEMOLICIÓN DE PARED Y COLUMNAS DEL CUARTO DE CONTROL.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.- SE REPUSO LA TOMA DE CILINDROS PARA SUS RESPECTIVOS ENSAYO DE RETORNO			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
10-04-2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA

No. 63



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.	CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS	CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>

ASUNTO: DEMOLICIÓN DE COLUMNS Y FUNDICIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
10/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wolsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 64

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ELECTRONICA

ASUNTO: ENCOFRADO DE TRINCHERA

PERSONAL UTILIZADO

1.- Residente de obra (1)

2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)

3.- Maestro mayor (1)

4.- Obreros (4)

5.- OPERADOR (1)

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.- HERRAMIENTA MANO

2.- RETRAXCAUDOS

3.-

4.-

5.-

VISITANTES

1.- ING. PEVIN CRUZ

2.-

3.-

CONDICIONES CLIMATICAS

SECADO

HORAS TRABAJADAS

2 HORAS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- ENCOFRADO PARA FUNDICIÓN DE MUELAS DE LA TRINCHERA TIPO B4 (LADO EXTERIOR)

2.- EXCAVACIÓN DE UN TRAMO DE TRINCHERA EN EL INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

11-04-2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 64



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: *Entendido de terreno*

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
11/04/2018	<i>Jose Castro</i> NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	<i>Jose Wonsang</i> NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 65

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: FUNDICIÓN DE MUROS

PERSONAL UTILIZADO

- 1.-Residente de obra (1)
- 2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)
- 3.-Maestro mayor (1)
- 4.-Obreros (4)
- 5.-

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

- 1.- HERRAMIENTAS YENDO
- 2.- CONCRETERA
- 3.- VIBRADOR
- 4.-
- 5.-

VISITANTES

- 1.-
- 2.-
- 3.-

CONDICIONES CLIMATICAS

SEQUEADO

HORAS TRABAJADAS

8 HORAS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 1.- FUNDICIÓN DE MURO DE TRINCHERA TIPO B4 LADO EXTERIOR
- 2.- FUNDICIÓN DE REPLANTILLO EN EL INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

Lugar y Fecha

12-04-2018

Por ELEGALAPAGOS S.A.

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

Por el CONTRATISTA

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 65



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO Nº 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

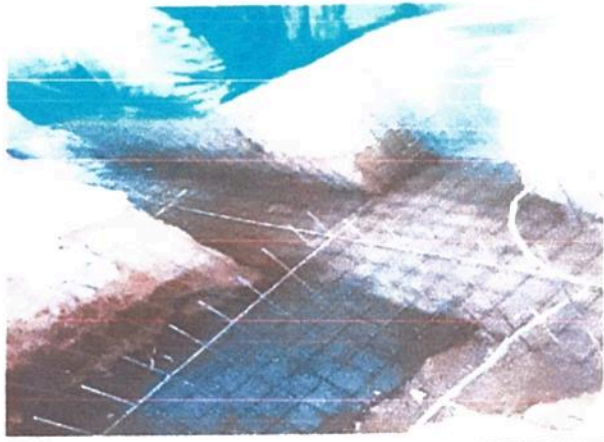
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: FUNDICIÓN DE MUROS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

12/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang
RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 66

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: *DESENCOFRADO Y ARMADO DE ESTRUCTURA*

PERSONAL UTILIZADO

- 1.- Residente de obra (1)
- 2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)
- 3.- Maestro mayor (1)
- 4.- Obreros (4)
- 5.- *SOLDADOR (1)*

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

- 1.- *HERRAMIENTA MENOR*
- 2.- *SOLDADORA*
- 3.- *CORTADORA METAL*
- 4.- *TALADRO*
- 5.-

VISITANTES

- 1.-
- 2.-
- 3.-

CONDICIONES CLIMATICAS

SOLEADO

HORAS TRABAJADAS

8

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 1.- *DESENCOFRADO DE MUROS FUNDIDOS DE TRINCHERA TIPO B4 (USO EXTERIOR)*
- 2.- *ARMADO DE ESTRUCTURA PARA TRINCHERA TIPO B4 (INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL)*
- 3.- *FABRICACIÓN DE ANCLAJES PARA TAPAS DE LA TRINCHERA (INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL)*
- 4.- *INICIO DE DESMONTAJE DE CUBIERTA DEL CUARTO DE CONTROL.*

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

- 1.- *Indicar la ENTREGA DE ANALISIS DE PRECIOS DE RUBROS DE O.C.*
- 2.- *Las ESPECIFICACIONES TECNICAS.*
- 3.- *ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PESO DE CERCITA.*

Lugar y Fecha

13-04-2018

Por ELEGALAPAGOS S.A.

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

Por el CONTRATISTA

NOMBRE: Ing. Jose W. ...

RESIDENTE DE OBRA



ELEGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA

No. 66

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ECTRONICA

ASUNTO: *DESARROLLO Y ARMADO DE ESTRUCTURA*

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

13/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 67

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: FUNDICIÓN DE PISO DE TRINCHERAS

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.- HERRAMIENTAS MANUALES

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

2.- CONCRETERA

3.-Maestro mayor (1)

3.- VIBRADOR

4.-Obreros (4)

4.- TALADRO

5.-

5.- SOLDADURA

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

1.-

SOLEADO

8

2.-

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- ARMADO DE ESTRUCTURA PARA TRINCHERA INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL

2.- FUNDICIÓN DE PISO DE TRINCHERA INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL.

3.- FINALIZACIÓN DE DESMONTAJE DE CUBIERTA DEL CUARTO DE CONTROL.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.- SE DEBE SACAR CILINDROS DE HORTIGON PARA EL CASO

2.- 40 DE ROSAS TALLA

3.-

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

14-04-2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Castro

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No.



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

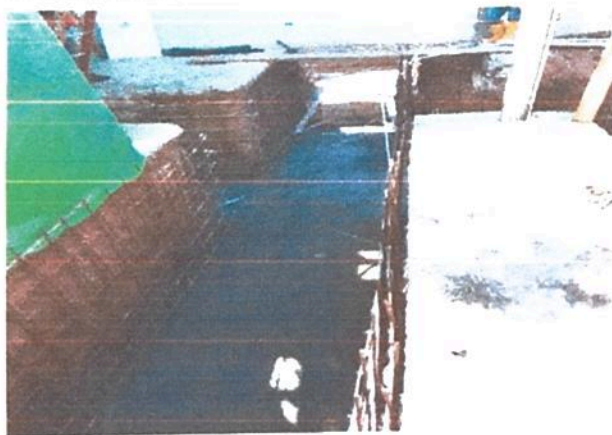
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐





ASUNTO: FUNDICIÓN DE PISO DE TRINCHERA

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
14/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

 ELEGALAPAGOS	<h2 style="margin: 0;">LIBRO DE OBRA</h2> <h3 style="margin: 0;">No. 68</h3> <p style="font-size: small; margin: 5px 0;">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>	
CONTRATO N° 005-2017		
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.	CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS	CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: <i>ENCOFRADO DE TUNCHERA, DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE CUBERTA</i>		
PERSONAL UTILIZADO	EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.- Residente de obra (1)	1.- <i>HERNANDEZ MENDEZ</i>	
2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)	2.-	
3.- Maestro mayor (1)	3.-	
4.- Obreros (4)	4.-	
5.-	5.-	
VISITANTES	CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-	SOLAR	5 HORAS
2.-		
3.-		
ACTIVIDADES REALIZADAS:		
1.- <i>ARMADO DE ENCOFRADO DE TUNCHERA INTERNA EN EL CUARTO DE CONTADOR.</i>		
2.- <i>DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DEL CUARTO DE CONTADOR.</i>		
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:		
1.-		
2.-		
3.-		
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:		
1.-		
2.-		
3.-		
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
15-04-2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 68



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA



☐ ELECTRONICA

ASUNTO: ENCOFRADO DE TRINCHERAS Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTO

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
15/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wansang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 69

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: FUNDICIÓN Y DESMONTAJE.

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.- HERRAMIENTAS MANUALES

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

2.- CONCRETERA

3.-Maestro mayor (1)

3.- VIBRADOR

4.-Obreros (6)

4.- SUELDOS

5.- SUELDOS (1)

5.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

1.-

SOLEADO

8 HORAS

2.-

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- FUNDICIÓN DE UN TAPADO DE MUROS DE TANCHERAS TPO 134 (INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL)

2.- DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DEL CUARTO DE CONTROL

3.- COLOCACIÓN DE CERCHA METALICA EN EL CUARTO DE CONTROL.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

16-04-2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 69



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: FUNDICION Y DESMONTAJE

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
16/04/2018	NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 70

AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: ARMADO DE ENCOFRADO

PERSONAL UTILIZADO

- 1.- Residente de obra (1)
- 2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)
- 3.- Maestro mayor (1)
- 4.- Obreros (5)
- 5.-

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

- 1.- HERRAMIENTAS MANUALES
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

- | CONDICIONES CLIMATICAS | HORAS TRABAJADAS |
|------------------------|------------------|
| <u>SOLEANDO</u> | <u>8 HORAS</u> |
| 1.- | |
| 2.- | |
| 3.- | |

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 1.- ARMADO DE ENCOFRADO PARA VINCHEA TIPO B4 (INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTO DE CONTRA)

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

17-04-2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 70



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: ARMADO DE ENCOFRADO

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
17/04/2018	<p>NOMBRE: Ing. Jose Castro</p> <p>FISCALIZADOR</p>	<p>NOMBRE: Ing. Jose Wonsang</p> <p>RESIDENTE DE OBRA</p>



LIBRO DE OBRA

No. 71

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ELECTRONICA

ASUNTO:

FUNDICION DE TRINCHERA

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.- Residente de obra (1)

1.- HERRAMIENTAS MANUALES

2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)

2.- CONCRETAS

3.- Maestro mayor (1)

3.- LIBRADOR

4.- Obreros (5)

4.- EXCAVADOR

5.- SOLDADOR (1)

5.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

1.- ING. FERNANDO VITERI

SOLEADO

2.- ING. LUIS UGUIS

8 HORAS

3.- ING. JIMMY ZAMBRANO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- SE CONTINUA CON LAS FUNDICIONES DE TRINCHERA TIPO B4

2.- SE INICIA CON LA COLOCACION DE CORREAS EN LA CERCIA METALICA EN LA AMPLIACION DEL CUADRO DE CONTROL.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.- SE ENTREGA A FISCALIZACION EL INFLUJE DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.- SE SOLICITA AL ING. POSICIONAR DE LA AL SER DE LA

2.- ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE TAPAS METALICAS AUTOMATICO

3.- EL PERSONAL, POR QUE TRABAJANDO DEL Y TIEMPO NO TERMINA

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

18-04-2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 71



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO Nº 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



ELECTRICA



ECTRONICA





ASUNTO: FUNDICION DE TRINCHERA

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
18/04/2018	 NOMBRE: Ing. José Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. José Wonsang RESIDENTE DE OBRA
