


	LIBRO DE OBRA No. 001		
"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: CHARLA DE SEGURIDAD E INICIO DE ACTIVIDADES			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros(3)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Lourdes Rodriguez		Nublado	8 Horas
2.- Ing. Kevin Cruz			
3.-Ing. Jimmy Zambrano			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Charla de induccion de ELEGALAPAGOS dirigida al personal de COFEKA.			
2.-Revision de planos con la Ing. Lourdes Rodriguez y fiscalizacion Ing. Jose Castro.			
3.-Demarcacion del transformador con cinta de peligro.			
4.-Replanteo del area de ampliacion.			
5.-Levantamiento de adoquines e inicio de excavacion de cimientos.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-Se procedera con la excavacion de cimientos			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
04/12/2017	NOMBRE: Ing. Jose Castro  FISCALIZADOR	NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta  RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 001



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☒ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: CHARLA DE SEGURIDAD E INICIO DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

04/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta
RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 002



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: EXCAVACIONES

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.- Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

2.-

3.-Maestro mayor (1)

3.-

4.-Obreros(3)

4.-

5.-

5.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

1.-

Soleado

8 Horas

2.-

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Continuación de excavaciones de plintos y rístras en los ejes #9A,9B,9C.

2.-Demolicion de tramo de contrapiso para la ampliacion del cuarto de control.

3.-Trazado de terreno para excavacion de trinchera tipo B4 (Según plano)

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

05/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE:Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 002



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: EXCAVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





2017/12/05

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

 ELEGALAPAGOS	LIBRO DE OBRA No. 003		
	"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO:TRAZADO Y EXCAVACION			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros(3)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Soleado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1. Inicio de trazado para excavacion para banco de ductos de 10x6"(según plano).			
2.-Retiro de grava del area para la excavacion de trinchera tipo B4 (Según plano).			
3.-Demolicion de contra piso para excavacion de riostra en diagonal en el eje 8 y 9B (según plano).			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
06/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nikolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 003



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☐ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: TRAZADO Y EXCAVACION

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





06/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 004		
	<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input type="checkbox"/> ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: COMPACTACION DE TERRENO			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- Compactador	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros(3)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Kevin Cruz		Nublado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Modificación del recorrido para banco de ductos de 10x6" solicitada por el Ing. Kevin Cruz.			
2.-Picada de hormigon armado para anclaje de riostras nuevas en el eje # 8A (según plano).			
3.-Corte y configuracion de hierro para plintos y columnas en los ejes #9A, 9B,9C.(según plano)			
4.-Compactacion de terreno para plintos en los ejes #9A, 9B,9C(según plano).			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
07/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Arq. Nicolas Parrita RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 004



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐





ASUNTO: COMPACTACION DE TERRENO

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
07/12/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Paralta RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 005		
<small>*AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA*</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: FUNDICION DE REPLANTILLO			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Concretera	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros(3)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Soleado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Se continua con el picado de hormigon de columnas antiguas para anclaje de riostras nuevas en el eje # 8C			
2.-Fundicion de replantillos para plintos en los ejes #9A, 9B,9C (según el plano), (hormigon simple).			
3.-Fundicion de cimientos tramos en los ejes # 9A,9B,9C (según el plano), (hormigon simple).			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
08/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 005



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐





ASUNTO: FUNDICION DE REPLANTILLO

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
08/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 006	
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>		
CONTRATO N° 005-2017		
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.	CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS	CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES		
PERSONAL UTILIZADO	EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)	1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)	2.-Concreteira	
3.-Maestro mayor (1)	3.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)	
4.-Obreros (3)	4.-	
5.-Operador (1)	5.-	
VISITANTES	CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Jinmy Zambrano	Soleado	5 Horas
2.-Ing. Fernando Viteri		
3.-		
ACTIVIDADES REALIZADAS:		
1.-Inicio de excavacion de terreno para trinchera tipo B4 (según plano) con retroexcavadora.		
2.-Fundicion de plintos en los ejes # 9A,9B,9C. según el plano		
3.-		
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:		
1.-El Ing. Mario Castro De Seguridad solicita a Fiscalizacion Ing. Jose Castro solicite a ELEGALAPAGOS provea de planos electricos para la continuacion de excavacion de trinchera debido a la presencia de cables, para evitar accidentes laborales.		
2.-		
3.-		
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:		
1.-		
2.-		
3.-		
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
2017/12/09	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA </div>



LIBRO DE OBRA No. 006



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐





ASUNTO: INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
2017/12/09	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 007		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (5)		4.-	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Nublado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.- Continuación de excavación de trinchera tipo B4 con retroexcavadora			
2.-Corte y configuración de hierro para riostras			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.		Por el CONTRATISTA
11/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR		 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 007



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐





ASUNTO: EXCAVACION

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
11/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Paraita RESIDENTE DE OBRA

	<p align="center">LIBRO DE OBRA No. 008</p> <p align="center">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>		
<p align="center">CONTRATO N° 005-2017</p>			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION Y ENCOFRADO DE RIOSTRAS			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (5)		4.-	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Nublado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Continuacion de excavacion de trinchera tipo B4 con retroexcavadora.			
2.-Armado e inicio de encofrado de riostras en ejes: #9; #8A-9A; #8B-9B.			
3.-Picado de ceramica de acera exterior del cuarto de control.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
12/12/2017	<div align="center">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>	<div align="center">  NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA </div>	



LIBRO DE OBRA No. 008



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: EXCAVACION Y ENCOFRADO DE RIOSTRAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha





Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

12/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta
RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 009		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION Y ENCOFRADO DE RIOSTRAS			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (5)		4.-Vibrador	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Nublado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Continuacion de excavacion de trinchera tipo B4 con retroexcavadora.			
2.-Finalizacion de encofrado de riostras en ejes: #9; #8A-9A; #8B-9B.			
3.- Finalizacion de picado de ceramica de acera exterior del cuarto de control.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-Se recomienda que se proceda con la construccion de la cercha para poder continuar con los rubros que tienen incidencia.			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
13/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 009



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ELECTRONICA





ASUNTO: EXCAVACION Y ENCOFRADO DE RIOSTRAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
13/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 010		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (5)		4.-Vibrador	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.- Ing Rafael Bastidas		Nublado	8 Horas
2.-Ing Jimmy Zambrano			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Continuacion de excavacion de trinchera tipo B4 con retroexcavadora.			
2.-Desalojo de material excavado a estoqueo.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.- Se presenta a fiscalizacion el Informe de dosificación para hormigones			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
14/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolás Peralta RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 010



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





14/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

 <p>ELEGALAPAGOS</p>	<p align="center">LIBRO DE OBRA No. 011</p> <p align="center">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>		
<p align="center">CONTRATO N° 005-2017</p>			
<p>CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.</p>		<p>CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.</p>	
<p>UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS</p>		<p>CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/></p>	
<p>ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL</p>			
<p align="center">PERSONAL UTILIZADO</p>		<p align="center">EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO</p>	
<p>1.-Residente de obra (1)</p>		<p>1.- Herramienta menor</p>	
<p>2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)</p>		<p>2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)</p>	
<p>3.-Maestro mayor (1)</p>		<p>3.-Concretera</p>	
<p>4.-Obreros (5)</p>		<p>4.-Vibrador</p>	
<p>5.-Operador (1)</p>		<p>5.-</p>	
<p align="center">VISITANTES</p>		<p align="center">CONDICIONES CLIMATICAS</p>	<p align="center">HORAS TRABAJADAS</p>
<p>1.-</p>		<p align="center">Nublado</p>	<p align="center">8 Horas</p>
<p>2.-</p>			
<p>3.-</p>			
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS:</p>			
<p>1.-Excavacion para banco de ductos 6x6" con retroexcavadora.</p>			
<p>2.-Desalojo de material excavado a estoqueo.</p>			
<p> </p>			
<p> </p>			
<p> </p>			
<p> </p>			
<p> </p>			
<p> </p>			
<p> </p>			
<p> </p>			
<p> </p>			
<p> </p>			
<p>CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:</p>			
<p>1.-</p>			
<p>2.-</p>			
<p>3.-</p>			
<p> </p>			
<p>INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:</p>			
<p>Se insiste en el pedido de la entrega del presupuesto de la ampliacion de la caseta con los precios</p>			
<p>2.-</p>			
<p>3.-</p>			
<p> </p>			
<p align="center">Lugar y Fecha</p>	<p align="center">Por ELEGALAPAGOS S.A.</p>	<p align="center">Por el CONTRATISTA</p>	
<p align="center">15/12/2017</p>	<p align="center">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </p>	<p align="center">  NOMBRE: Arq. Nicolas Paraita RESIDENTE DE OBRA </p>	



LIBRO DE OBRA No. 011



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

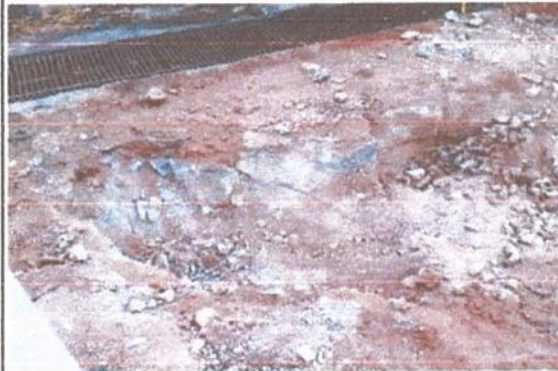
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐





ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
15/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arg. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

	<p align="center">LIBRO DE OBRA No. 012</p> <p align="center">*AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA*</p>		
<p align="center">CONTRATO N° 005-2017</p>			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (5)		4.-Vibrador	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Nublado	5 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.			
2.-Desalojo de material excavado a estoqueo.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
16/12/2017	<div align="center">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>	<div align="center">  NOMBRE: Arg. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA </div>	



LIBRO DE OBRA No. 012



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA C.A. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐



ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
16/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arg. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 013		
"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input type="checkbox"/> ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (5)		4.-Vibrador	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Nublado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.			
2.-Desalojo de material excavado a estoqueo.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Lugar y Fecha			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
18/12/2017	NOMBRE: Ing. Jose Castro	NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta	
	FISCALIZADOR	RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 013



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





18/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

	<p align="center">LIBRO DE OBRA No. 014</p> <p align="center">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>		
<p align="center">CONTRATO N° 005-2017</p>			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION Y FUNDICION DE RIOSTRAS			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concreteira	
4.-Obreros (5)		4.-Vibrador	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Nublado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.			
2.-Retiro de grava para excavacion de banco de ductos de 6x6" (según plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro electrico			
3.-Desalojo de material excavado a estoqueo.			
4.-Fundicion de riostras en ejes: #9; #8A-9A; #8B-9B. Con hormigon de 210 kg/cm2.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-Se tomo muestras de hormigon en cilindros para su posterior rotura y verificacion de su resistencia.			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
19/12/2017	<div align="center">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>	<div align="center">  NOMBRE: Arg. Nicolás Peralta RESIDENTE DE OBRA </div>	



LIBRO DE OBRA No. 014



AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: EXCAVACION Y FUNDICION DE RIOSTRAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





19/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 015		
	<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION Y FUNDICION DE COLUMNAS			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (5)		4.-Vibrador	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Nublado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.			
2.-Excavacion manual para de banco de ductos de 6x6" (según plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro eléctrico.			
3.- Desencofrado de riostras. Encofrado de columnas en el eje # 9A,9C (según plano).			
4.-Fundicion de columnas en el eje # 9A,9C (según el plano).			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
20/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Arg. Nicolás Peralta RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 015



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐



ASUNTO: EXCAVACION Y FUNDICION DE COLUMNAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
20/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arg. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 016		
"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input type="checkbox"/> ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION, FUNDICION DE COLUMNA Y DESALOJO DE MATERIAL			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (4)		4.-Vibrador	
5.-Operador (1)		5.-Andamios	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Lourdes Rodriguez		Nublado	8 Horas
2.-Ing. Jimmy Zambrano			
3.-Ing. Luis Ugsha			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.			
2.-Excavacion manual para de banco de ductos de 6x6" (según plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro electrico.			
3.-Encofrado y fundicion de columna en el eje # 9B (según el plano).			
4.-Desalojo de material excavado.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
21/12/2017	NOMBRE: Ing. Jose Castro	NOMBRE: Arg. Nicolas Peralta	
	FISCALIZADOR	RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 016



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ECTRONICA

☐

ASUNTO: EXCAVACION, FUNDICION DE COLUMNA Y DESALOJO DE MATERIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





21/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arg. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

 ELEGALAPAGOS	LIBRO DE OBRA No. 017		
	"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input type="checkbox"/> ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACIONES Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Andamios	
4.-Obreros (5)		4.-	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing.Jimmy Zambrano		Soleado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.			
2.-Excavacion manual para de banco de ductos de 6x6" (según plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro electrico.			
3.-Colocacion de mamposteria en el eje #8C,9C (Según plano)			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.		Por el CONTRATISTA
22/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR		 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 017



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐





ASUNTO: EXCAVACIONES Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
22/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arg. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

	<h2 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h2> <h3 style="text-align: center;">No. 018</h3> <p style="text-align: center; font-size: small;">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACIONES, COLOCACION DE MAMPOSTERIA Y CONSTRUCCION DE CASETA PARA MATERIALES			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Andamios	
4.-Obreros (4)		4.-	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Nublado	4 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.- Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.			
2.- Excavacion manual para de banco de ductos de 6x6" (según plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro electrico.			
3.- Colocacion de mamposteria en el eje #9B,9C (Según plano).			
4.- Nivelacion e inicio de construccion de bodega para materiales.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.		Por el CONTRATISTA
23/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR		 NOMBRE:Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 018



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: EXCAVACIONES, COLOCACION DE MAMPOSTERIA Y CONSTRUCCION DE CASETA PARA MATERIALES

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





23/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 019		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input type="checkbox"/> ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MATERIALES			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.- Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.- Maestro mayor (1)		3.-	
4.- Obreros (2)		4.-	
5.- Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Nublado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.- Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.			
2.- Continuacion de la construccion de la bodega para materiales.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.		Por el CONTRATISTA
25/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR		 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 019



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐





ASUNTO: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MATERIALES

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
25/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

	<h1 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h1> <h2 style="text-align: center;">No. 020</h2>		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
<h3>CONTRATO N° 005-2017</h3>			
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION, CONSTRUCCION DE BODEGA, FUNDICION DE VIGUETAS			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.- Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.- Maestro mayor (1)		3.- Concretera	
4.- Obreros (3)		4.- Vibrador	
5.- Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.- Ing. Fernando Viteri		Nublado	8 Horas
2.- Ing. Luis Ugsha			
3.- Ing. Lourdes Rodriguez			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.- Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.			
2.- Finalizacion de la construccion de la bodega para materiales.			
3.- Instalacion de tubo PVC=4" para drenaje de agua lluvia en el eje 9C.			
4.- Corte, configuracion de hierro para viguetas de amare en el eje #9B, 9C Y #8C, 9C.			
5.- Fundicion de viguetas de amarre en el eje #9B, 9C Y #8C, 9C.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.- No se puede avanzar rapidamente con la excavacion para el banco de ductos debido a que la constitucion del terreno es 100% rocoso, por esta razon se esta utilizando roto martillo instalado en la retroexcavadora.			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.- se recomienda una vez mas la construccion de la sercha para proceder con el cambio de la cubierta en area de ampliacion de la caseta.			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
26/12/2017	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA </div>	



LIBRO DE OBRA No. 020



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA



☐ ECTRONICA





ASUNTO: EXCAVACION, CONSTRUCCION DE BODEGA, FUNDICION DE VIGUETAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
26/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arg. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

 ELEGALAPAGOS	LIBRO DE OBRA No. 021		
	"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACIONES ,COMPACTACION Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concreteira	
4.-Obreros (3)		4.Compactador	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing Fernando Viteri		Nublado	8 Horas
2.-Ing. Luis Ugsha			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.- Finalizacion de excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.			
2.- Colocacion de mamposteria en los ejes #8A,9A.			
3.- Rasanteo y compactacion de un tramo de terreno para trinchera tipo B4 para replantillo.			
4.-Excavacion para banco de ductos de 4x6" hacia los transformadores.			
5.-Replantillo de un tramo de trinchera tipo B4.			
6.- Estoqueo de material excavado.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.- Se suspende la obra por motivos de fiesta de fin de año.			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.		Por el CONTRATISTA
27/12/2017	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR		 NOMBRE:Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 021



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: EXCAVACIONES ,COMPACTACION Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





27/12/2017

NOMBRE:Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE:Arq.Nicolas Paralta

RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 022		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACIONES Y ENCOFRADO DE VIGUETAS			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (4)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Soleado	8 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion para banco de ductos de 4x6 en direccion a las oficinas de ELEGALAPAGOS.			
2.-Finalizacion de excavacion manual para de banco de ductos de 6x6" (según plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro eléctrico.			
3.-Armado y encofrado de pilaretes entre los ejes #8A, 9A.			
4.Estoqueo de material excavado.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-No se a presentado la planilla de avance de obra del primer mes.			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
04/01/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Beratta RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 022



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: EXCAVACIONES Y ENCOFRADO DE VIGUETAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

04/01/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 023



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ELECTRONICA

ASUNTO: EXCAVACIONES Y FUNDICION DE PILARETES

PERSONAL UTILIZADO

- 1.-Residente de obra (1)
- 2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)
- 3.-Maestro mayor (1)
- 4.-Obreros (4)
- 5.-

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

- 1.-Herramienta menor
- 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharón)
- 3.-Concretera
- 4.-Vibrador
- 5.-

VISITANTES

- 1.-Ing. Lourdes Rodriguez
- 2.-Ing. Fernando Viteri
- 3.-

CONDICIONES CLIMATICAS

Soleado

HORAS TRABAJADAS

8 Horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 1.-Finalización de excavación para banco de ductos de 4x6" en dirección a las oficinas de ELECGALAPAGOS.
- 2.-Conexión de tubería de desagüe de aguas lluvias al pozo.
- 3.-Fundición de pilares entre los ejes #8A, 9A.
- 4.-Encofrado de un tramo de trinchera tipo B4 para fundición de muro de piedra
- 5.-Corte y configuración de hierro para banco de ductos de 4x6".

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

05/01/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arg. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 023



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

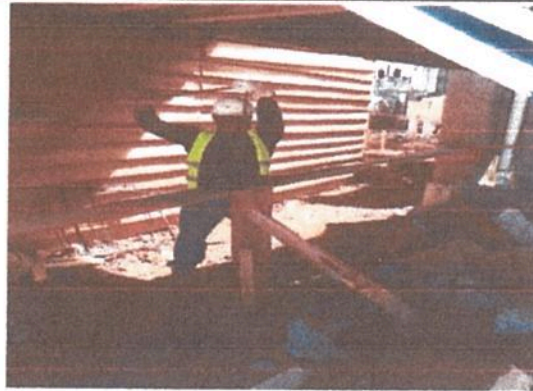
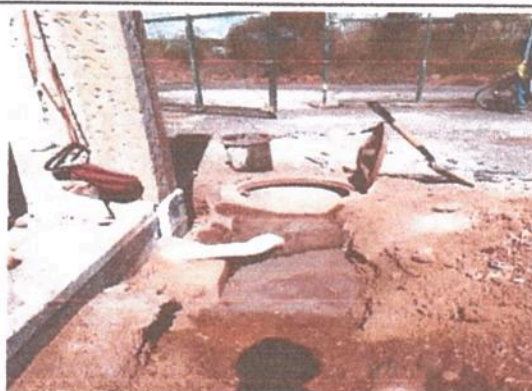
CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ELECTRONICA

ASUNTO: EXCAVACIONES Y FUNDICION DE PILARETES

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





05/01/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

	<h1 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h1> <h2 style="text-align: center;">No. 024</h2>		
<small>*AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA*</small>			
<h3 style="text-align: center;">CONTRATO N° 005-2017</h3>			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		Civil <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: FUNDICION DE MURO DE PIEDRA, DESALOJO DE MATERIAL EXCAVADO			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concreteira	
4.-Obreros (4)		4.-Vibrador	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Soleado	4 Horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Corte y configuracion de hierro para banco de ductos de 4x6".			
2.-Fundicion de un tramo de muro de piedra en trinchera tipo B4 .			
3.- Desalojo de material excavado.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
06/01/2018	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Arq. Nicolas Paralta RESIDENTE DE OBRA </div>	



LIBRO DE OBRA No. 024



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐



ASUNTO: FUNDICION DE MURO DE PIEDRA, DESALOJO DE MATERIAL EXCAVADO

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
06/01/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA

	<h2 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h2> <h3 style="text-align: center;">No. 025</h3>		
<p style="text-align: center;">*AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA*</p>			
<h3 style="text-align: center;">CONTRATO N° 005-2017</h3>			
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		Civil <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: ENCOFRADO DE MURO DE PIEDRA, CORTE DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Cortadora de hormigon	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (4)		4.-Vibrador	
		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Fernando Viteri		Nublado	8 Horas
2.-Ing. Luis Ugsha			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.- Desencofrado de un tramo de muro de piedra en trinchera tipo B4 .			
2.-Encofrado y fundicion de un tramo de muro de piedra en trinchera tipo B4 .			
3.-Trazado y corte de ceramica en el cuarto de control con máquina cortadora.			
4.- Construccion de base para motor de aire acondicionado del cuarto de control			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
08/01/2018	NOMBRE: Ing. Jose Castro	NOMBRE: Arg. Nicolas Peralta	
	FISCALIZADOR	RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 025



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: ENCOFRADO DE MURO DE PIEDRA, CORTE DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





08/01/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

	<h1 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h1> <h2 style="text-align: center;">No. 026</h2>		
<p style="text-align: center;">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>			
<h3 style="text-align: center;">CONTRATO N° 005-2017</h3>			
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: DESENCOFRADO DE MURO DE PIEDRA, RETIRO DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (7)		4.-	
		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Fernando Viteri		Soleado	8 Horas
2.-Ing. Kevin Cruz			
3.-Ing. Jimmy Zambrano			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Desencofrado de un tramo de muro de piedra en trinchera tipo B4 .			
2.-Inicio de retiro de ceramica dentro cuarto de control			
3.-Rasanteo de cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS			
4.-Armado de vigas entre los ejes #9A,9B,9C.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
09/01/2018	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta RESIDENTE DE OBRA </div>	



LIBRO DE OBRA No. 026



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: DESENCOFRADO DE MURO DE PIEDRA, RETIRO DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA



09/01/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Arq. Nicolas Peralta

RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 027		
<small>*AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA*</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: TRABAJOS EN DUCTOS DE 4X6'			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (7)		4.-	
		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Kevin Cruz		Soleado	8 Horas
2.-Ing. Jimmy Zambrano			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Nivelacion con arena de cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS			
2.-Encofrano para cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS			
3.-Corte y aramado de acero para cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS			
4.- Colocacion de tuberia en banco de ductos con estructura en ductos de 4 x 6"			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.- Ingreso del Ing Jose Wonsang como residente de obra.			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
10/01/2018	NOMBRE: Ing. Jose Castro	NOMBRE: Ing Jose Wonsang	
	FISCALIZADOR	RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 027



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐





ASUNTO: TRABAJOS EN DUCTOS DE 4X6'

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
10/01/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

	<p align="center">LIBRO DE OBRA No. 028</p>		
<p align="center">*AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA*</p>			
<p align="center">CONTRATO N° 005-2017</p>			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: TRABAJOS EN DUCTOS DE 4X 6', ROTURA DE CONTRAPISO PARA TRINCHERAS.			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- Rotomartillo	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (7)		4.-	
		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Kevin Cruz		Soleado	8 Horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.Colocacion en terreno de acero de refuerzo de cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELEGALAPAGOS			
2.Colocacion en terreno de tubería para cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELEGALAPAGOS			
3.-Corte y aramado de acero para cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELEGALAPAGOS			
4.- Demolicion de piso para trinchera en el cuarto de control.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.- SE PIDE DE MANERA URGENTE QUE SE AGILITE EL TRABAJO DE CUBIERTA EN CUERTO DE CONTROL.			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
11/01/2018	<div align="center">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>	<div align="center">  NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA </div>	



LIBRO DE OBRA No. 028



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐





ASUNTO: TRABAJOS EN DUCTOS DE 4X 6', ROTURA DE CONTRAPISO PARA TRINCHERAS.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
11/01/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

	<p align="center">LIBRO DE OBRA No. 029</p>		
<p align="center">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>			
<p align="center">CONTRATO N° 005-2017</p>			
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4X 6".			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (7)		4.-	
		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Kevin Cruz		Soleado	8 Horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.Colocacion de tubería para alambre de tierra para cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS			
2.-Fundicion de un tramo de ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS			
3.-Ingreso de agregado fino y grueso para hormigon.			
4.- Armado encofrado y acero de cajas numero 4.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
12/01/2018	<div align="center">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>	<div align="center">  NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA </div>	



LIBRO DE OBRA No. 029



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



ELECTRICA



ECTRONICA









ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4X 6".

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
12/01/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 030		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4X 6".			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Retroexcavadora	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (7)		4.-	
5.-Operador (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
		Soleado	4 Horas
		Soleado	4 Horas
		Soleado	4 Horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.Fundicion de un tramo ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELEGALAPAGOS			
2.- Excavacion en roca para cajas tipo N4			
3.- Encofrado y nivelacion de un tramo de ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELEGALAPAGOS			
4.- Armado encofrado y acero de cajas numero 4.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.		Por el CONTRATISTA
13/01/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR		 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 030



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO Nº 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

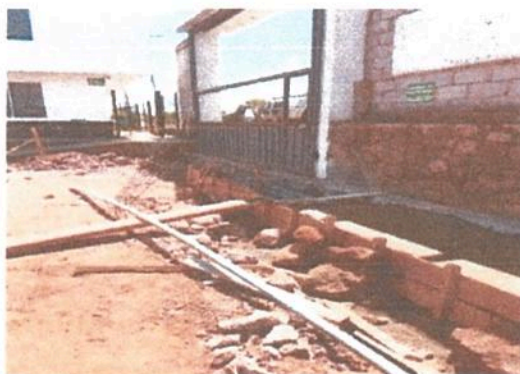
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4X 6".

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha





Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

13/01/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang
RESIDENTE DE OBRA

	<h1 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h1> <h2 style="text-align: center;">No. 031</h2>		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4X6" Y CAJAS DE PASO			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Concretera	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Vibrador	
4.-Obreros (7)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Fernando Viteri		Soleado	8 horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Fundicion de dos cajas de pasada en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS			
2.-Finalizacion de la fundicion de los ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS			
3.-Armado de hierro para banco de ductos en diagonal de 10x6"			
4.-			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
15/01/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang	
	FISCALIZADOR	RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 031



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐





ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4X6" Y CAJAS DE PASO

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
15/01/018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 032		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: TRABAJO EN DUCTOS DE 10X6" Y EXCAVACION DE TRINCHERA			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (7)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Rafael Bastidas		Soleado	8 horas
2.-Ing. Kevin Cruz			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Nivelacion con arena en la diagonal para banco de ductos de 10x6".			
2.-Armado de encofrado para banco de ductos de 10x6".			
3.-Corte y configuracion de hierro para armadura de banco de ductos de 10x6".			
3.-Inicio de excavacion manual para trinchera en el cuarto de control.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
16/01/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 032



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐





ASUNTO: TRABAJO EN DUCTOS DE 10X6" Y EXCAVACION DE TRINCHERA

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
16/01/018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 033		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input type="checkbox"/> ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: TRABAJO EN DUCTOS DE 10X6" Y EXCAVACION DE TRINCHERA			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Concretera	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Vibrador	
4.-Obreros (7)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Rafael Bastidas		Soleado	8 horas
2.-Ing. Kevin Cruz			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Armado de estructura y encofrado de caja tipo 2.			
2.-Armado y encofrado de un tramo para banco de ductos de 10x6".			
3.-Corte y configuracion de hierro para armadura de banco de ductos de 10x6".			
4.-Fundicion de un tramo de banco de ductos de 10x6".			
5.- Excavacion manual para trinchera en el cuarto de control.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-Se presenta a fiscalizacion los resultados de ensayos de cilindros de hormigon			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.		Por el CONTRATISTA
17/01/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR		 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 033



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

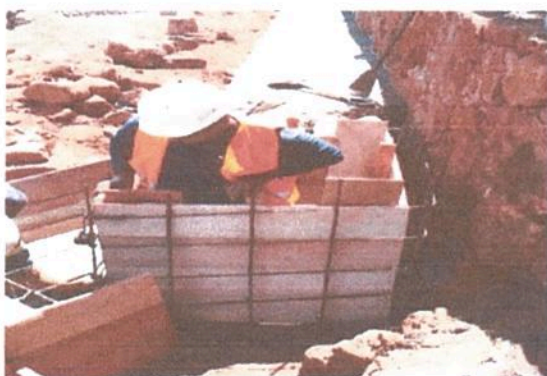
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐



ASUNTO: TRABAJO EN DUCTOS DE 10X6" Y EXCAVACION DE TRINCHERA

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
17/01/018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 034		
<small>*AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA*</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 10X6" Y EXCAVACION DE TRINCHERA			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Concretera	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Vibrador	
4.-Obreros (7)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Rafael Bastidas		Nublado	8 horas
2.-Ing. Luis Ugsha			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Fundicion de un tramo en diagonal de banco de ductos de 10x6".			
2.-Corte y configuracion de hierro para armadura de banco de ductos de 10x6".			
3.-Excavacion manual para trinchera en el cuarto de control.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
18/01/2018	NOMBRE: Ing. Jose Castro	NOMBRE: Ing. Jose Wonsang	
	FISCALIZADOR	RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 034



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

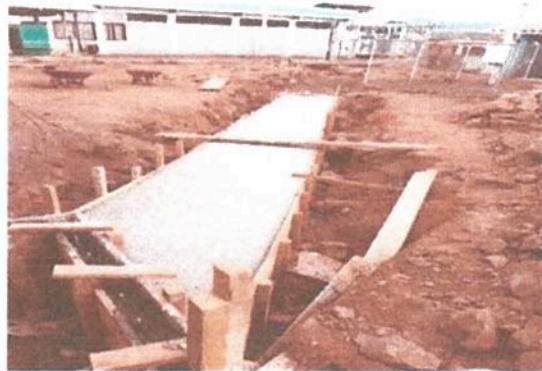
CIVIL

☒ ELECTRICA



☐ ECTRONICA





ASUNTO: FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 10X6" Y EXCAVACION DE TRINCHERA

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
18/01/018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

 ELEGALAPAGOS	LIBRO DE OBRA No. 035		
	<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input type="checkbox"/> ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 10x6"			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Concretera	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Vibrador	
4.-Obreros (7)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Soleado	8 horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Relleno manual de sobre ancho de ductos de 10x6".			
2.-Corte y configuracion de hierro para armadura de banco de ductos de 10x6".			
3.- Instalacion de tuberia (10ux6"+1ux2") en ductos de 10x6".			
4.-Fundicion de segundo tramo en diagonal de banco de ductos de 10x6".			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.		Por el CONTRATISTA
19/01/2018	 NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR		 NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 035



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ECTRONICA

ASUNTO: FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 10X6"

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





19/01/018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA

	<h1 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h1> <h2 style="text-align: center;">No. 036</h2>		
<p style="text-align: center;">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>			
<h3 style="text-align: center;">CONTRATO N° 005-2017</h3>			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: CORTE Y CONFIGURACION DE HIERRO DE ARMADURA PARA BANCO DE DUCTOS DE 10x6".			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (7)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		Soleado	4 horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Corte y configuracion de hierro para armadura de banco de ductos de 10x6".			
2.-Relleno manual de segundo tramo sobre ancho de ductos de 10x6".			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.		Por el CONTRATISTA
20/01/2018	<div style="text-align: center;">  NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>		<div style="text-align: center;">  NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA </div>



LIBRO DE OBRA No. 036



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ELECTRONICA



☐





ASUNTO: CORTE Y CONFIGURACION DE HIERRO DE ARMADURA PARA BANCO DE DUCTOS DE 10x6".

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
20/01/018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

 ELEGALAPAGOS	LIBRO DE OBRA No. 037 <small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>	
CONTRATO N° 005-2017		
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>
ASUNTO: CORTE Y CONFIGURACION DE HIERRO PARA ARMADURA DE BANCO DE DUCTOS DE 10x6".		
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-
3.-Maestro mayor (1)		3.-
4.-Obreros (6)		4.-
5.-		5.-
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS
1.-		Soleado
2.-		
3.-		
		8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:		
1.-Corte y configuracion de hierro para armadura de banco de ductos de 10x6".		
2.-Relleno manual de segundo tramo sobre ancho de ductos de 6x10.		
3.-Excavacion manual para trinchera en el cuarto de control.		
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:		
1.- Se cumplen los trabajos para fundicion de ductos de 10x6" programados para martes 23 de Enero.		
2.-		
3.-		
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:		
1.-Se insiste en el pedido de la cercha, para poder continuar con los trabajos en la casata de ampliacion		
2.-		
3.-		
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
22/01/2018	 NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 037



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐





ASUNTO: CORTE Y CONFIGURACION DE HIERRO PARA ARMADURA DE BANCO DE DUCTOS DE 10x6".

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
22/01/018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 038		
"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: INSTALACION DE DUCTERIA EN EL BANCO DE DUCTOS DE 10x6".			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (7)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Rafael Bastidas		Soleado	8 horas
2.-Ing. Kevin Cruz			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Instalacion de ducteria en banco de ductos de 10x6".			
2.-Instalacion de lona de proteccion en cuarto de control.			
3.-Instalacion encofrado en banco de ductos de 10x6".			
4.- Relleno y nivelacion de sobreancho de ducto de 4x6".			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
<p>Luego de la reunión en obra conformada por: Ing. Jose Wonsang, Ing. Jose Castro, Ing. Kevin Cruz, Ing. Rafael Bastidas Se resuelve los siguientes cambios:</p> <p>1.-Aumentar un ducto de 4x6" desde el canal del transformador a la caja tipo N#1. (7ml aproximadamente). 2.-Rotura de costrapiso en sala de control para conectar un ducto de 6x6" entre trincheras. (2ml aproximadamente). 3.-Fuera del cuarto de control junto al cerramiento se une la trinchera al banco de ductos de 6x4" para salir hacia la acera en un banco de ductos de 10x6".</p>			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-Se recomienda colocar el cable 4.0, antes de fundir el ducto entre la caja que termina el ducto diagonal,y la caja que termina la trinchera			
2.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
23/01/2018	NOMBRE:Ing. Jose Castro 	NOMBRE:Ing. Jose Wonsang 	
	FISCALIZADOR	RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 038



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐





ASUNTO: INSTALACION DE DUCTERIA EN EL BANCO DE DUCTOS DE 10x8".

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
23/01/018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

	<p align="center">LIBRO DE OBRA No. 039</p>		
<p align="center">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>			
<p align="center">CONTRATO N° 005-2017</p>			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input type="checkbox"/> ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: PRIMERA ETAPA DE FUNDICION DE UN TRAMO DE BANCO DE DUCTOS DE 10x6".			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Concreteira	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Vibrador	
4.-Obreros (7)		4.- Rotomartillo	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.- Ing. Jimmy Zambrano		Soleado	8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Fundicion de tramo de banco de ductos de 10x6".			
2.-Ampliacion de caja tipo #1.			
3.-Excavacion manual para trinchera en el cuarto de control.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-Por un acuerdo entre la empresa constructora y la administracion del contrato,por falta del cable,4.0, y no retrazar con la fundicion se procede a autorizar dejar un tuberia de 2",para posteriormente colocarlo			
2.-Desde ya se solicita la compra del material necesario para el encofrado de la trinchera			
La presencia de la tuberia de desagüe que dificulta la construccion de la trinchera, se recomienda suspender esta tuberia y hacer un d			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.		Por el CONTRATISTA
24/01/2018	<div align="center">  NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>		<div align="center">  NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA </div>



LIBRO DE OBRA No. 039



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: PRIMERA ETAPA DE FUNDICION DE UN TRAMO DE BANCO DE DUCTOS DE 10x6".

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





24/01/018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA

	<h1 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h1> <h2 style="text-align: center;">No. 040</h2>		
<p style="text-align: center;">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>			
<h3 style="text-align: center;">CONTRATO N° 005-2017</h3>			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: FUNDICION DE TRAMO DE BANCO DUCTOS DE 10x6".			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Concretera	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Vibrador	
4.-Obreros (7)		4.- Rotomartillo	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
		Soleado	8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Fundicion de tramo de banco de ductos de 10x6".			
2.-Ampliacion de caja tipo #1.			
3.-Excavacion manual para ductos de 4x6"			
4.- Armado de estructura de acero para banco de ductos de 4x6"			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.		Por el CONTRATISTA
25/01/2018	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>		<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA </div>



LIBRO DE OBRA No. 040



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: FUNDICION DE TRAMO DE BANCO DUCTOS DE 10x8".

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
25/01/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 041



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ECTRONICA

ASUNTO: FUNDICION DE UN TRAMO DE BANCO DE DUCTOS DE 4x6".

PERSONAL UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

3.-Maestro mayor (1)

4.-Obreros (7)

5.-

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Herramienta menor

2.-Concretera

3.-Vibrador

4.- Rotomartillo

5.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

Soleado

8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Fundicion de banco de ductos de 4x6".

2.-Ampliacion de caja existente.

3.-Excavacion manual para trincheras.

4.- Armado y fundicion de caja tipo #1.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

26/01/2018

NOMBRE:Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE:Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 041



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: FUNDICION DE UN TRAMO DE BANCO DE DUCTOS DE 4x6".

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

26/01/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 042



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: Excavacion manual para ducto de 4x6".

PERSONAL UTILIZADO

- 1.-Residente de obra (1)
- 2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)
- 3.-Maestro mayor (1)
- 4.-Obreros (7)
- 5.-

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

- 1.-Herramienta menor
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

Soleado

8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 1.-Excavacion manual para ducto de 4x6". En diagonal desde el transformador a la caja.
- 2.-Relieno de sobre ancho de excavacion de ductos de 10x6". Entre la cistema y bordillo exterior.
- 3.-Excavacion manual para trincheras. Dentro del cuarto de control.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Una vez mas se solicita la presencia en obra de la Cercha, que permitira continuar con los trabajos dentro de caseta de control

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

27/01/2018

NOMBRE:Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE:Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 042



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: Excavacion manual para ducto de 4x6".

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





27/01/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA

	<h2 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h2> <h3 style="text-align: center;">No. 043</h3> <p style="text-align: center; font-size: small;">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: Excavacion manual para trincheras interna y externa.			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Rotomartillo	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (7)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
		Soleado	8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion manual para trincheras interna y externa. Dentro del cuarto de control y la externa junto al cerramiento lateral.			
2.-Excavacion manual para ducto de 4x6". En diagonal desde el transformador a la caja.			
3.-Rotura de caja y de contrapiso del cuarto de control.			
4.- Armado de estructura de acero para ductos de 4x6". En diagonal desde el transformador a la caja.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Se solicita, traer el material necesario para el encofrado de los muros de la trinchera,si como tambien los chanel, que debe ser fundido en el muro de las trincheras			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
29/01/2018	 NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 043



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ECTRONICA

ASUNTO: Excavacion manual para trincheras interna y externa.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
29/01/2018	NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 044



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ECTRONICA

ASUNTO: INSTALACION DE DUCTERIA DE 6" Y FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 4x6"

PERSONAL UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

3.-Maestro mayor (1)

4.-Obreros (7)

5.-

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Herramienta menor

2.-Rotomartillo

3.-Concretera

4.-

5.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

Soleado

8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion manual para trincheras interna y externa. Dentro del cuarto de control y la externa junto al cerramiento lateral.

2.- Armado de estructura de acero para ductos de 4x6" y 10x6". Entre cerramiento y cuarto de control.

3.-Rotura de caja y de muro de cerramiento para pasar con ducto de 10x6".

4.- Instalacion de ducteria de 6" y fundicion de ducto de 4x6". Entre cerramiento y cuarto de control.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Se solicita la presencia en obra, de la retroexcavadora, a fin de terminar con el rubro excavacion y desalojo.

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

30/01/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 044



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: INSTALACION DE DUCTERIA DE 6" Y FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 4x6"

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

30/01/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 045



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



LECTRICA



ECTRONICA



ASUNTO: FUNDICION DE DUCTO DE 4x6". EN DIAGONAL DEL TRANSFORMADOR

PERSONAL UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

3.-Maestro mayor (1)

4.-Obreros (7)

5.-

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Herramienta menor

2.-Concretera

3.-

4.-

5.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

Soleado

8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Fundicion de ducto de 4x6". En diagonal desde el transformador a la caja.

2.-fundicion de ducto de 10x6". Entre cuarto de control y cerramiento lateral.

3.-Excavacion manual para trincheras interna . Dentro del cuarto de control.

4.-Fundicion de caja externa, entre cerramiento lateral y poste.

5.- fundicion de caja que conecta ducto de 4x6" y trinchera externa, junto a cerramiento lateral.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Se solicita la presencia en obra, de la retroexcavadora, a fin de terminar con el rubro excavacion y desalojo.

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

31/01/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Worisang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 045



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



LECTRICA



ECTRONICA



ASUNTO: FUNDICION DE DUCTO DE 4x6". EN DIAGONAL DEL TRANSFORMADOR

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

31/01/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 046



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION PARA DUCTERIA			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (7)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.- Ing kevin Cruz		Soleado	8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion para ducto de 4x6" y cajas. Dentro de jaula de transformadores .			
2.-Armado de estructura para ductos de 4x6". Para ductos dentro de jaula de transformadores.			
3.-Excavacion manual para trincheras interna . Dentro del cuarto de control.			
4.-Relleno de sobre sobreancho de ductos fundidos.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.- SE SOLICITO EL MEJORAMIENTO DE UNA CAJA EXTERNA POR PARTE DEL ING CRUZ.			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Se solicita la presencia en obra, de la retroexcavadora, a fin de terminar con el rubro excavacion y desalojo.			
Se solicita la presencia en obra de todos los materiales necesarios para continuar con los trabajos,especialmente de la cercha para la cubierta ,que semana a semana vienen ofreciendo, pero hasta esta fecha hay incumplimiento,no hay seriedad en la empresa constructora.			
El relleno debe ser con matariaa adecuado ,como dice la norma y de prestamo.			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
01/02/2018	 NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 046



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐





ASUNTO: EXCAVACION PARA DUCTERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
01/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 047		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4x6" HACIA LA JAULA DE TRANSFORMADORES			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Concretera	
3.-Maestro mayor (1)		3.- Vibrador	
4.-Obreros (7)		4.-	
		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Fernando Viteri		Soleado	8 horas
2.-Jimmy Zambrano			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.- Instalacion de tuberia para ducto de 4x6" y cajas. Dentro de jaula de transformadores .			
2.-Armado de encofrado para ductos de 4x6" y cajas. Dentro de jaula de transformadores.			
3.-fundicion de ductos 4x6" y cajas. hacia la jaula de transformadores.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Recuerdo que el relleno se debe hacer con material de prestamo clasell, en capas compactadas de 20cm, como dice la norma se equier la presencia en obra de los cercos metalicos para construir las tapas de las cajas de paso.			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
02/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 047



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐



ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4x6" HACIA LA JAULA DE TRANSFORMADORES

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
02/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 048		
<small>*AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA*</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: INSTALACION DE TUBERIA DE 4x6" Y CAJAS DENTRO DE LA JAULA DE TRANSFORMADORES.			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-Concretera	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Vibrador	
4.-Obreros (7)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
		Soleado	4 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.- Instalacion de tuberia para ducto de 4x6" y cajas. Dentro de jaula de transformadores.			
2.-Armado de encofrado para ductos de 4x6" y cajas. Dentro de jaula de transformadores.			
3.-fundicion de ductos 4x6" y cajas. dento de jaula de transformadores. Segundo tramo			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
03/02/2018	NOMBRE: Ing. Jose Castro	NOMBRE: Ing. Jose Wonsang	
	FISCALIZADOR	RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 048



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



ELECTRICA



ECTRONICA







ASUNTO: INSTALACION DE TUBERIA DE 4x6" Y CAJAS DENTRO DE LA JAULA DE TRANSFORMADORES.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
03/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

 ELEGALAPAGOS	LIBRO DE OBRA No. 049		
	"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION MANUAL PARA TRICHERAS INTERNAS			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (6)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
		Soleado	8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion manual para trincheras interna . Dentro del cuarto de control.			
2.-Excavacion manual para trincheras externa, junto a cerramiento lateral. Dentro del cuarto de control.			
3.-Armado y fundicion de caja, ubicada en el exterior de la planta junto al poste.			
4.-Relleno de sobre sobrecancho de ductos fundidos.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Nuevamente me toca insistir en la presencia en obra de la cercha para el cambio de cubierta.			
los canalales los materiales, para el encofrado de los muros de la trinchera			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
05/02/2018	 NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 049



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐





ASUNTO: EXCAVACION MANUAL PARA TRICHERAS INTERNAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
05/02/2018	NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

	<p align="center">LIBRO DE OBRA No. 050</p>		
<p align="center">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>			
<p align="center">CONTRATO N° 005-2017</p>			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION PARA DUCTERIA CON MAQUINA			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- Rotomartillo	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Retroexcavadora	
4.-Obreros (6)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.- Ing. Luis Ugsha		Soleado	8 horas
2.-Ing. Kevin Cruz			
3.- Ing Fernando Viteri			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion y rotura manual para trincheras interna . Dentro del cuarto de control.			
2.-Excavacion y rotura de roca para caja. Junto a tanque de combustible.			
3.-Armado y fundicion de tapas para cajas.			
4.-Relleno de sobre sobrecancho de ductos fundidos.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
El relleno debe ser realizado de acuerdo a las normas de construccion, con materal de prstamo y la compactacion en capas de 0,20 m			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
05/02/2018	<div align="center">  NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>	<div align="center">  NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA </div>	



LIBRO DE OBRA No. 050



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐





ASUNTO: EXCAVACION PARA DUCTERIA CON MAQUINA

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
05/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

 ELEGALAPAGOS	LIBRO DE OBRA No. 051 <small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> LECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: FUNDICION Y EXCAVACION			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- Rotomartillo	
3.-Maestro mayor (1)		3.-Concretera	
4.-Obreros (6)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing Kevin Cruz		Soleado	8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion manual para trincheras interna . Dentro del cuarto de control.			
2.-Fundicion de ducto de 4x 6" dentro del cuarto de control.			
3.-Armado y fundicion de tapas para cajas.			
4.-Excavacion de trinchera externa. Junto al cerramiento lateral.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
07/02/2018	 NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 051



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐





ASUNTO: FUNDICION Y EXCAVACION

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
07/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

	<h2 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h2> <h3 style="text-align: center;">No. 052</h3> <p style="text-align: center; font-size: small;">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION DE TRINCHERA Y FUNDICION DE DUCTOS			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- Rotomartillo	
3.-Maestro mayor (1)		3.- Concretera	
4.-Obreros (6)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Fernando Viteri		Soleado	8 horas
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion manual para trincheras interna y externa del cuarto de control.			
2.-Instalacion de ductos y fundicion de ducto de 6x 6" de caja junto a transformador a caja junto a tanques de combustible.			
3.-Instalacion de porcelanato sobre ducto en cuarto de control.			
4.-Nivelacion y relleno de sobreancho de ductos.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
08/02/2018	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Ing. José Castro FISCALIZADOR </div>	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Ing. José Wonsang RESIDENTE DE OBRA </div>	



LIBRO DE OBRA No. 052



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

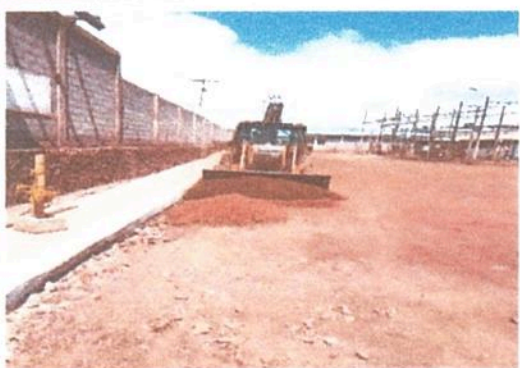
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐



ASUNTO: EXCAVACION DE TRINCHERA Y FUNDICION DE DUCTOS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
08/02/2018	NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 053		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: EXCAVACION MANUAL DE TRINCHERAS INTERNAEN EL CUARTO DE CONTROL			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- Rotomartillo	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (6)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
		Soleado	8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion manual para trincheras interna y externa del cuarto de control.			
2.-Armado de tapas para cajas.			
3.-Rotura de homigon para trinchera.			
4.-Desalojo de escombros de carpinteria.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
09/02/2018	NOMBRE:Ing. Jose Castro	NOMBRE:Ing. Jose Wonsang	
	FISCALIZADOR	RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 053



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐





ASUNTO: EXCAVACION MANUAL DE TRINCHERAS INTERNAEN EL CUARTO DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
09/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

 ELEGALAPAGOS	<h2 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h2> <h3 style="text-align: center;">No. 054</h3> <p style="text-align: center;">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> LECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: Fundicion de caja. Union de ductos con trinchera.			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (6)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
		Soleado	4 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Fundicion de caja. Union de ductos con trinchera.			
2.-Fundicion de tapas para cajas.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.		Por el CONTRATISTA
10/02/2018	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>		<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA </div>



LIBRO DE OBRA No. 054



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



LECTRICA



ECTRONICA







ASUNTO: Fundicion de caja. Union de ductos con trinchera.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
10/02/2018	<p>NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR</p>	<p>NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA</p>

	LIBRO DE OBRA No. 055		
	<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>		
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> LECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (6)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
		Soleado	8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Enlucido en paredes de cuerto de control.			
2.-Desencofrado de cajas.			
3.-Movimiento de tierra.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
14/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 055



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

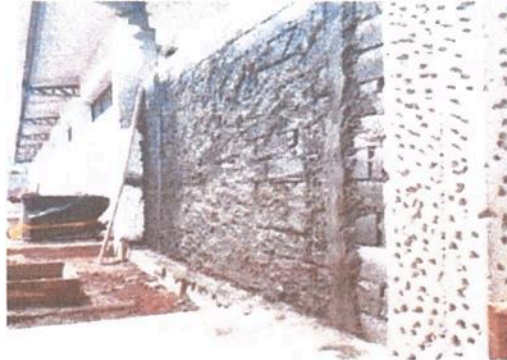
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ LECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐





ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
14/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 056		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (6)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
		Soleado	8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Enlucido en paredes de cuerto de control.			
2.-Excavacion de trinchera dentro y fuera de la sala de control.			
3. Instalaciones electricas en ampliacion del cuerto de control.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-Las actividades se paralizan debido a los problemas de transporte maritimo para el traslado de material a GALAPAGOS			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
15/02/2018	NOMBRE:Ing. Jose Castro  FISCALIZADOR	NOMBRE:Ing. Jose Wonsang  RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 056



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐



ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
15/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 057		
<small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>			
CONTRATO N° 005-2017			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (4)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
		Soleado	8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.			
2.-Armado de encofrado para vigas de cubierta. Cuarto de control			
3. Instalacion de placas de acero galvanizado de 10mm en cabeza de columnas.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.- Se reinician las actividades de trabajo .			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
03/04/2018	NOMBRE: Ing. Jose Castro	NOMBRE: Ing. Jose Wonsang	
	FISCALIZADOR	RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 057



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



ELECTRICA



ECTRONICA



ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
03/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 058



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

PERSONAL UTILIZADO	EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)	1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)	2.-	
3.-Maestro mayor (1)	3.-	
4.-Obreros (4)	4.-	
5.-	5.-	
VISITANTES	CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
	Soleado	8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

2.-Armado de encofrado para vigas de cubierta. Cuarto de control

3. Traslado de celdas y accesorios de puerto a obra.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
04/04/2018	 NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 058



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
04/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wolfang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 057



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.-Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

2.-

3.-Maestro mayor (1)

3.-

4.-Obreros (4)

4.-

5.-

5.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

Soleado

8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

2.-Armado de encofrado para vigas de cubierta. Cuarto de control

3. Instalacion de placas de acero galvanizado de 10mm en cabeza de columnas.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.- Se reinician las actividades de trabajo .

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
03/04/2018	 NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA No. 057

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



ELECTRICA



ELECTRONICA



ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

03/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 058



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.	CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS	CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

PERSONAL UTILIZADO	EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)	1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)	2.-	
3.-Maestro mayor (1)	3.-	
4.-Obreros (4)	4.-	
5.-	5.-	
VISITANTES	CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
	Soleado	8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:
1.-Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.
2.-Armado de encofrado para vigas de cubierta. Cuarto de control
3. Traslado de celdas y accesorios de puerto a obra.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-
2.-
3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
04/04/2018	 NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 058



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



ELECTRICA

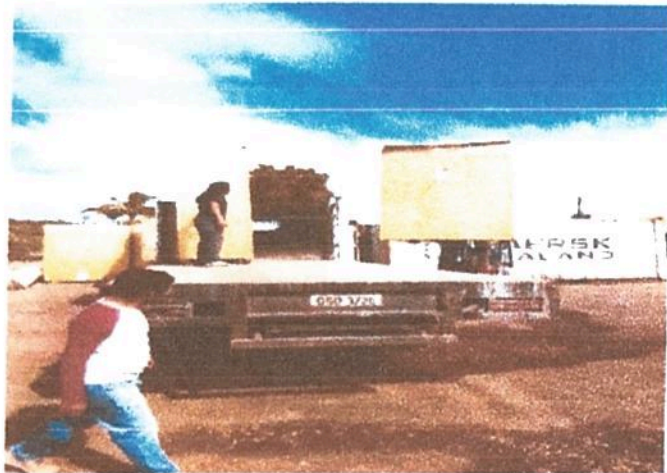


ELECTRONICA



ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

04/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 59

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: <i>ARMADO DE ESTRUCTURA DE VIGAS Y ENCOFRADO</i>			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- <i>HERRAMIENTAS MENOR</i>	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (14)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-			
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1. <i>ARMADO DE ESTRUCTURA PARA VIGAS EN LOS EJES 8A-9A, 9B, 8C, 9C</i>			
2. <i>ARMADO DE ENCOFRADO PARA VIGAS EN EL CUARTO DE AMPLIACIÓN</i>			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
<i>05-04-2018</i>	<i>[Firma]</i> NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	<i>[Firma]</i> NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA

No. 59

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



ELECTRICA



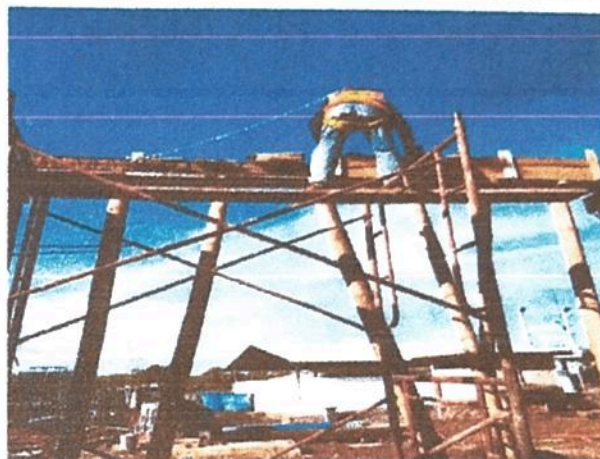
ECTRONICA



ASUNTO:

ALVARO DE ESTRUCTURA DE VIGAS Y ENCONTRADO

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

05/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 60

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ECTRONICA

ASUNTO: ENCOFRADO Y FUNDICIÓN

PERSONAL UTILIZADO

- 1.-Residente de obra (1)
- 2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)
- 3.-Maestro mayor (1)
- 4.-Obreros (4)
- 5.-

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

- 1.- HERRAMIENTAS MANUALES
- 2.- CONCRETA
- 3.- VIBRADOR
- 4.-
- 5.-

VISITANTES

- 1.-
- 2.-
- 3.-

CONDICIONES CLIMATICAS

SOLEDAD

HORAS TRABAJADAS

8 H

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- ARMADO DE ESTRUCTURA DE TRINCHERA TIPO B4 (UNDO EXTERIOR)

2.- ENCOFRADO DE VIGAS PARA CONCRETA EN LOS EJES 8-4A; 4B, 8C y 7C

3.- FUNDICIÓN DE VIGAS EN LOS EJES 8A-4A; 4B; 8C-4C

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

06-04-2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 60



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐



ASUNTO: ENCOFRADO Y FUNDICIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
06/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Woreang RESIDENTE DE OBRA

	<h1 style="text-align: center;">LIBRO DE OBRA</h1> <h2 style="text-align: center;">No. 61</h2>		
<p style="text-align: center;">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>			
<h3 style="text-align: center;">CONTRATO Nº 005-2017</h3>			
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: <i>ARMADO DE ESTRUCTURA PARA TRINCHERA</i>			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- <i>HERMIENTA MENOR</i>	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (4)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		<i>SOLEADO</i>	<i>4 HORAS</i>
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
<i>1.- ARMADO DE ESTRUCTURA DE TRINCHERA TIPO 34 (LADO EXTERIOR)</i>			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
<i>07-04-2018</i>	NOMBRE: Ing. Jose Castro	NOMBRE: Ing. Jose Monsang	
	FISCALIZADOR	RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 61



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



ELECTRICA



ECTRONICA



ASUNTO: *ARMADO DE ESTRUCTURA PARA TANCHERA*

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

07/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 62



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: ARMADO DE ESTRUCTURAS Y DEMOLICIÓN			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.- Residente de obra (1)		1.- HERRAMIENTA MENOR	
2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- RETROEXCAVADORA	
3.- Maestro mayor (1)		3.-	
4.- Obreros (4)		4.-	
5.- OPERADOR (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		SOLEADO	8 HORAS
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1. ARMADO DE ESTRUCTURA PARA TRINCHERA TIPO B4 (LADO EXTERIOR)			
2. DEMOLICIÓN DE PARED Y COLUMNAS EN EL EJE B DEL CUARTO DE CONTROL PARA AMPLIACIÓN.			
3. ARREGLO DE MALLA DE PUESTA A TIERRA.			
4.-			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
04-04-2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Worsing RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA

No. 62



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: *ARMADO DE ESTRUCTURA Y DEMOLICIÓN*

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

09/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Monsang

RESIDENTE DE OBRA



ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA

No. 63



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: DEMOLICIÓN DE COLUMNAS Y FUNDICIÓN			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.- Residente de obra (1)		1.- HERRAMIENTA MENOR	
2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- RETRAXADORA	
3.- Maestro mayor (1)		3.- CONCRETO	
4.- Obreros (4)		4.- VIBRADOR	
5.- OPERADOR (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		SOLEADO	8 HORAS
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1. DEMOLICIÓN DE PARED, COLUMNA, VIGAS EN EL EJE 8 PARA AMPLIACIÓN DEL CUARTO DE CONTROL.			
2. FUNDICIÓN DE PISO DE TRINCHERA TIPO B4 LADO EXTERIOR.			
3. DESARROLLO DE ENSAYOS DE LA DEMOLICIÓN DE PARED Y COLUMNAS DEL CUARTO DE CONTROL.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.- SE REQUIERE LA TOMA DE MUESTRAS PARA SUS RESPECTIVOS ENSAYO DE RETORNO			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
10-04-2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA

No. 63



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017



CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.	CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS	CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>

ASUNTO: DEMOLICIÓN DE COLUMNS Y FUNDICIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
10/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wolsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 64

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ELECTRONICA

ASUNTO: ENCOFRADO DE TRINCHERA

PERSONAL UTILIZADO

1.- Residente de obra (1)

2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)

3.- Maestro mayor (1)

4.- Obreros (4)

5.- OPERADOR (1)

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.- HERRAMIENTA MANO

2.- RETRAXCAVADOR

3.-

4.-

5.-

VISITANTES

1.- ING. PEVIN CRUZ

2.-

3.-

CONDICIONES CLIMATICAS

SECADO

HORAS TRABAJADAS

2 HORAS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- ENCOFRADO PARA FUNDICIÓN DE MUELAS DE LA TRINCHERA TIPO B4 (LADO EXTERIOR)

2.- EXCAVACIÓN DE UN TRAMO DE TRINCHERA EN EL INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

11-04-2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 64



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: *ENCUENTRO DE TUBERÍA*

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
11/04/2018	<i>Jose Castro</i> NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	<i>Jose Wonsang</i> NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 65

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: FUNDICIÓN DE MUROS

PERSONAL UTILIZADO	EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)	1.- HERRAMIENTAS VARIAS	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)	2.- CONCRETERA	
3.-Maestro mayor (1)	3.- VIBRADOR	
4.-Obreros (4)	4.-	
5.-	5.-	
VISITANTES	CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-	Soleado	8 Horas
2.-		
3.-		

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 1.- FUNDICIÓN DE MURO DE TRINCHERA TIPO B4 LADO EXTERIOR
- 2.- FUNDICIÓN DE REPLANTILLO EN EL INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
12-04-2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 65



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: FUNDICIÓN DE MUROS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

12/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang
RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 66

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: *DESENCUFRADO Y ARMADO DE ESTRUCTURA*

PERSONAL UTILIZADO

- 1.- Residente de obra (1)
- 2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)
- 3.- Maestro mayor (1)
- 4.- Obreros (4)
- 5.- *SOLDADOR (1)*

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

- 1.- *HERRAMIENTA MENOR*
- 2.- *SOLDADORA*
- 3.- *CORTADORA METAL*
- 4.- *TALADRO*
- 5.-

VISITANTES

- 1.-
- 2.-
- 3.-

CONDICIONES CLIMATICAS

SOLEADO

HORAS TRABAJADAS

8

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 1.- *DESENCUFRADO DE MURD FUNDIDOS DE TRINCHERA TIPO B4 (USO EXTERIOR)*
- 2.- *ARMADO DE ESTRUCTURA PARA TRINCHERA TIPO B4 (INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL)*
- 3.- *FABRICACIÓN DE ANCLAJES PARA TAPAS DE LA TRINCHERA (INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL)*
- 4.- *INICIO DE DESMONTAJE DE CUBIERTA DEL CUARTO DE CONTROL.*

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

- 1.- *Indicar la ENTREGA DE ANALISIS DE PRECIOS DE RUBROS DE O.C.*
- 2.- *Las ESPECIFICACIONES TECNICAS.*
- 3.- *ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPO ESTIMADO.*

Lugar y Fecha

13-04-2018

Por ELEGALAPAGOS S.A.

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

Por el CONTRATISTA

NOMBRE: Ing. Jose W. W. W.

RESIDENTE DE OBRA



ELEGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA

No. 66



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



ELECTRICA

ELECTRONICA



ASUNTO: DESARROLLO Y ARMADO DE ESTRUCTURA

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

13/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 67

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: FUNDICIÓN DE PISO DE TRINCHERAS

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.- HERRAMIENTAS MANUALES

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

2.- CONCRETERA

3.-Maestro mayor (1)

3.- VIBRADOR

4.-Obreros (4)

4.- TALADRO

5.-

5.- SOLDADURA

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

1.-

SOLEADO

8

2.-

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- ARMADO DE ESTRUCTURA PARA TRINCHERA INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL

2.- FUNDICIÓN DE PISO DE TRINCHERA INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL.

3.- FINALIZACIÓN DE DESMONTAJE DE CUBIERTA DEL CUARTO DE CONTROL.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.- SE DEBE SACAR CILINDROS DE HORTIGON PARA EL CASO

2.- 40 DE ROSAS TALLA

3.-

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

14-04-2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Castro

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No.



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

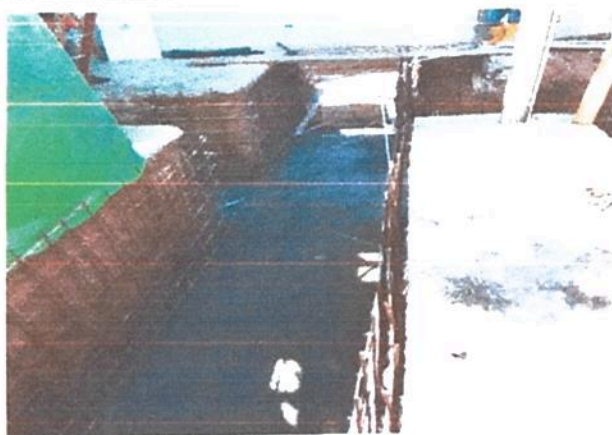
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐





ASUNTO: FUNDICIÓN DE PISO DE TRINCHERA

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
14/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

 ELEGALAPAGOS	<h2 style="margin: 0;">LIBRO DE OBRA</h2> <h3 style="margin: 0;">No. 68</h3> <p style="font-size: small; margin: 5px 0;">"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</p>	
CONTRATO N° 005-2017		
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.	CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS	CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: <i>ENCOFRADO DE TUNCHERA, DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE CUBERTA</i>		
PERSONAL UTILIZADO	EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.- Residente de obra (1)	1.- <i>HERNANDEZ MENDEZ</i>	
2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)	2.-	
3.- Maestro mayor (1)	3.-	
4.- Obreros (4)	4.-	
5.-	5.-	
VISITANTES	CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-	SOLAR	5 HORAS
2.-		
3.-		
ACTIVIDADES REALIZADAS:		
1.- <i>ARMADO DE ENCOFRADO DE TUNCHERA INTERNA EN EL CUARTO DE CONTADOR.</i>		
2.- <i>DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DEL CUARTO DE CONTADOR.</i>		
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:		
1.-		
2.-		
3.-		
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:		
1.-		
2.-		
3.-		
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
15-04-2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 68



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA



☐ ELECTRONICA

ASUNTO: ENCOFRADO DE TRINCHERAS Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTO

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
15/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wansang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 69

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: FUNDICIÓN Y DESMONTAJE.

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.- HERRAMIENTAS MANUALES

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

2.- CONCRETO

3.-Maestro mayor (1)

3.- VIBRADOR

4.-Obreros (6)

4.- SUELDOS

5.- SUELDOS (1)

5.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

1.-

SOLEADO

8 HORAS

2.-

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- FUNDICIÓN DE UN TAPADO DE MUROS DE TANCHERAS TPO 134 (INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL)

2.- DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DEL CUARTO DE CONTROL

3.- COLOCACIÓN DE CERCHA METÁLICA EN EL CUARTO DE CONTROL.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

16-04-2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 69

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: FUNDICION Y DESMONTAJE

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
16/04/2018	NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 70

AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: ARMADO DE ENCOFRADO

PERSONAL UTILIZADO

- 1.- Residente de obra (1)
- 2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)
- 3.- Maestro mayor (1)
- 4.- Obreros (5)
- 5.-

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

- 1.- HERRAMIENTAS MANUALES
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

- | CONDICIONES CLIMATICAS | HORAS TRABAJADAS |
|------------------------|------------------|
| <u>SOLEANDO</u> | <u>8 HORAS</u> |
| 1.- | |
| 2.- | |
| 3.- | |

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 1.- ARMADO DE ENCOFRADO PARA VINCHEA TIPO B4 (INTERIOR Y EXTERIOR DEL CORDON DE CONTROL)

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

17-04-2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 70



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: ARMADO DE ENCOFRADO

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
17/04/2018	<p>NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR</p>	<p>NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA</p>



LIBRO DE OBRA

No. 71

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ELECTRONICA

ASUNTO:

FUNDICION DE TRINCHERA

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.- Residente de obra (1)

1.- HERRAMIENTAS MANUALES

2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)

2.- CONCRETAS

3.- Maestro mayor (1)

3.- LIBRADOR

4.- Obreros (5)

4.- EXCAVADOR

5.- SOLDADOR (1)

5.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

1.- ING. FERNANDO VITERI

SOLEADO

2.- ING. LUIS UGUIS

8 HORAS

3.- ING. JIMMY ZAMBRANO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- SE CONTINUA CON LAS FUNDICIONES DE TRINCHERA TIPO B4

2.- SE INICIA CON LA COLOCACION DE CORREAS EN LA CERCIA METALICA EN LA AMPLIACION DEL CUADRO DE CONTROL.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.- SE ENTREGA A FISCALIZACION EL INFLUJE DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.- SE SOLICITA AL ING. POSICIONAR DE LA AL SER DE LA

2.- ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE TAPAS METALICAS AUTOMATICO

3.- EL PERSONAL, POR QUE TRABAJANDO DEL Y TIEMPO NO TERMINA

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

18-04-2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 71



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO Nº 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



ELECTRICA



ECTRONICA



ASUNTO: FUNDICION DE TRINCHERA

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
18/04/2018	 NOMBRE: Ing. José Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. José Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 72

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ELECTRONICA

ASUNTO: DESENCUFRADO Y COMPACTACIÓN

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.- Herramienta Menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

2.- Computador

3.-Maestro mayor (1)

3.-

4.-Obreros (5)

4.-

5.-

5.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

1.-

2.-

3.-

Soleado

8 HORAS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. DESENCUFRADO DE TRINCHERA

2. Colocación de mampostería en el eje 9A

3. Compactación de piso en el cuarto de control

4. Colocación de correas metálicas en la estructura metálica

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1. Que se acelere el trabajo en la cubierna; esta

2. 1107 1070 y aumentar personal el contratista

3.-

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

14-04-2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No.



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

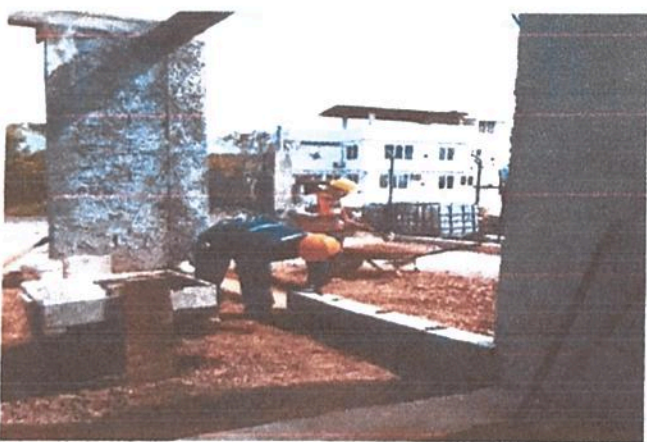
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.





Por el CONTRATISTA

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonding

RESIDENTE DE OBRA

 ELEGALAPAGOS	<div style="text-align: center;"> LIBRO DE OBRA No. 73 </div> <div style="text-align: center; font-size: small;"> "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA" </div>	
CONTRATO N° 005-2017		
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>
ASUNTO: FUNDICIÓN CONTRAPISO		
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.- Residente de obra (1)		1.- HELADORA MENCHI
2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- CONCRETERA
3.- Maestro mayor (1)		3.- VIBRADOR
4.- Obreros (4)		4.-
5.- SUDADERA		5.-
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS
1.-		SOLEADO
2.-		
3.-		
ACTIVIDADES REALIZADAS:		HORAS TRABAJADAS
1.- FUNDICIÓN DE CONTRAPISO (AMPLIACIÓN DEL CUADRO DE CONTROL)		
2.- SE INICIA CON LA COLOCACIÓN DE TECHO (EN EL CUADRO DE CONTROL)		
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:		
1.-		
2.-		
3.-		
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:		
1.-		
2.-		
3.-		
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
20-04-2018	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR </div>	<div style="text-align: center;">  NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA </div>



LIBRO DE OBRA No. 73



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: FUNDICION DE CONTRAPISO

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
20/04/2018	NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	NOMBRE: Ing. Jose Wensang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 74



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ECTRONICA

ASUNTO: ENLUCIDO DE PARED INTERIOR

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.- HEREDIA MENDEZ

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

2.-

3.-Maestro mayor (1)

3.-

4.-Obreros (4)

4.-

5.-

5.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

1.-

2.-

3.-

SOLEADO

4 HORAS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. ENLUCIDO DE PARED INTERIOR EN EL CUARTO DE CONTROL

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

21-04-2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 74



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: ENLUCIDO DE PARED INTERIOR

REGISTRO FOTOGRAFICO:



FOTO 3

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

21/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 75

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: ENLUCIDO DE PARED EXTERIOR

PERSONAL UTILIZADO

- 1.-Residente de obra (1)
- 2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)
- 3.-Maestro mayor (1)
- 4.-Obreros (4)
- 5.- *Electricista (1)*

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

- 1.- *HERRAMIENTA MENOR*
- 2.- *CONCRETERA*
- 3.- *SOLDADORA*
- 4.-
- 5.-

VISITANTES

- 1.-
- 2.-
- 3.-

CONDICIONES CLIMATICAS

SOLEADO

HORAS TRABAJADAS

8 HORAS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. ENLUCIDO DE PARED EXTERIOR EN EL CUARTO DE CONTRA.
2. CORTE Y CONFIGURACIÓN DE HIERRO PARA TAPAS DE TRINCHERA
3. ENCOFRADO Y FUNDICIÓN DE TAPAS PARA TRINCHERA
4. COLOCACIÓN DE TAPAS METÁLICAS EN LA TRINCHERA INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

23-04-2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 75



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

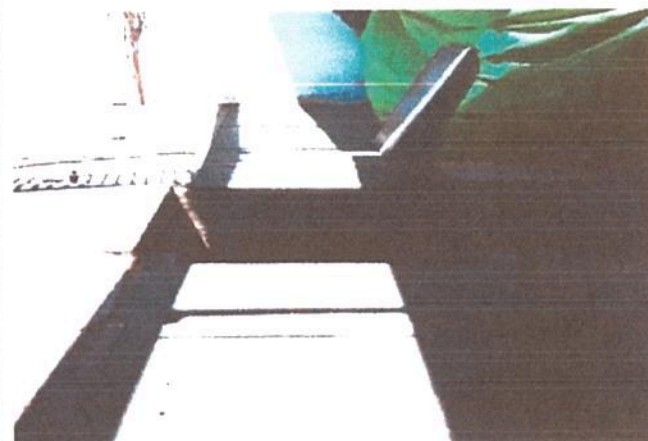
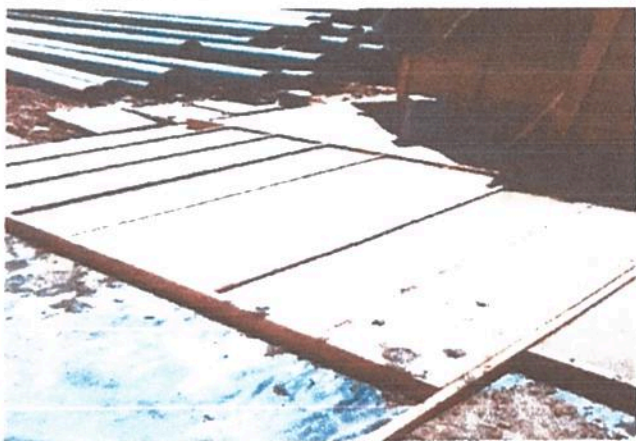
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: ENLUCIDO DE PARED EXTERIOR

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

23/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 76

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ELECTRONICA

ASUNTO: FUNDICIÓN DE TAPAS

PERSONAL UTILIZADO

- 1.- Residente de obra (1)
- 2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)
- 3.- Maestro mayor (1)
- 4.- Obreros (4)
- 5.- Cuidador (1)

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

- 1.- HERRAMIENTAS MENOR
- 2.- CONCRETERA
- 3.- SOLDADURA
- 4.-
- 5.-

VISITANTES

- 1.-
- 2.-
- 3.-

CONDICIONES CLIMATICAS

SOLEADO

HORAS TRABAJADAS

8 HORAS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. INICIO DE PARED EXTERIOR EN EL CUARTO DE CONTROL
2. ENCOFRADO Y FUNDICIÓN DE TAPAS PARA TRENCHERA EXTERIOR
3. TRABAJOS EN LA ESTRUCTURA DE COBIERTA EN EL CUARTO DE CONTROL

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1. LA USAS DEBEN SER TAPAS SIN CARLOS DE ANGULO DE
2. A CORO
3. LA CERAMICA DEBE SER COLOCADA CON BONDAX

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

24-04-2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



ELEGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA No. 76

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

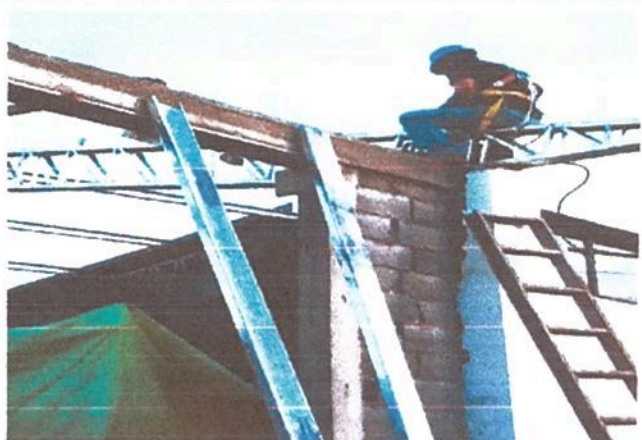
CIVIL

☒ ELECTRICA

☐ ELECTRONICA

ASUNTO: FUNDICION DE TAPAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

24/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 77



AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: FUNDICIÓN Y ENLACE DE TAPAS			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.- Residente de obra (1)		1.- HERRAMIENTAS MENOR	
2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- CONCEPTOS	
3.- Maestro mayor (1)		3.- VIBRADOR	
4.- Obreros (4)		4.- SUDADOR	
5.- SUDADOR (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		SOLEADO	8 HORAS
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.- REPOSICIÓN DE BLOQUES JUNTO AL CUERPO DE CONTROL			
2.- FUNDICIÓN DE TAPAS PARA TRINCHERA			
3.- ENLACE DE TAPAS EN EL CUERPO DE CONTROL			
4.- REPOSICIÓN DE ADOSQUIN EN LA ENTRADA DEL CUERPO DE CONTROL			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.- Fiscalización urgente según la memoria con cemento (no			
2.- no se impiden trabajos de saneo)			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.- Decidir la construcción del Alcantaral para la			
2.- edificación de puertas y ventanas			
3.- Construir Quin y la Columna Cielo Raso			
Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
25-04-2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 77



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA C.A. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: FUNDICION Y ENLUCIDO DE FAJAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
25/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 78



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: *REPOSICION DE ADOQUIN*

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.- *HERNANDEZ HENRI*

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

2.- *SOLARDO*

3.-Maestro mayor (1)

3.-

4.-Obreros *(4)*

4.-

5.- *SOLARDO*

5.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

1.- *ING. JIMMY ZARAGOZA*

NUBLADO

8 HORAS

2.-

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- *REPOSICION DE ADOQUIN (JUNTO AL CUARTO DE CONTROL)*

2.- *ENCUADO DE FASAS EN EL CUARTO DE CONTROL*

3.- *INICIO DE CUBIERTA DE CERRAJES EN EL CUARTO DE CONTROL*

4.- *CUBIERTA DE TECHO DE CUBIERTA EN EL CUARTO DE CONTROL*

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.- *DE DECOMANDO SUBCONTRATAR, LOS RUBROS DE CUBIERTA DE CERRAJES*

2.- *PINTURA, ESTUCADO, COMO TAMBIEN CUBIERTA DE ALUMINIO*

3.- *Y VISIONES EN VISTA SIN TUBERIA NI MATERIAL NI PERSONAL DONDE SE*

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

26-04-2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 78



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: REPOSICION DE ADOQUIN

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





26/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA

 ELECGALAPAGOS	LIBRO DE OBRA No. 79 <small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>	
CONTRATO N° 005-2017		
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>
ASUNTO: <u>COLOCACIÓN DE CERÁMICA</u>		
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1)		1.- <u>HERRAMIENTAS MENOR</u>
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-
3.-Maestro mayor (1)		3.-
4.-Obreros (4)		4.-
5.- <u>SONDADOR (1)</u>		5.-
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS
1.-		<u>SOLEADO</u>
2.-		
3.-		
		HORAS TRABAJADAS
		<u>8 HORAS</u>
ACTIVIDADES REALIZADAS:		
<u>1. COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN EL PISO DE EL CUARTO DE CONTROL</u>		
<u>2. COLOCACIÓN DE MAHPOSTERÍA</u>		
<u>3. ENVOLDO DE TUBOS E INICIO DE COLOCACION DE GRAVA.</u>		
<u>4. COLOCACIÓN DE TECHO (COMBINACIÓN)</u>		
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:		
1.-		
2.-		
3.-		
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:		
<u>1. SIN ACCIÓN DEFINIDA COMO LA OBRERA, COLOCACIÓN DE</u>		
<u>2. CUBO PISO, TUBOS, PLATOS Y COLOCACIÓN DE ALUMENIOS Y</u>		
<u>3. VIDRIOS, NO SE PUEDE TERMINAR AMPLIACIÓN DE CASCA</u>		
Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
<u>27-04-2018</u>	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 79

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



ELECTRICA

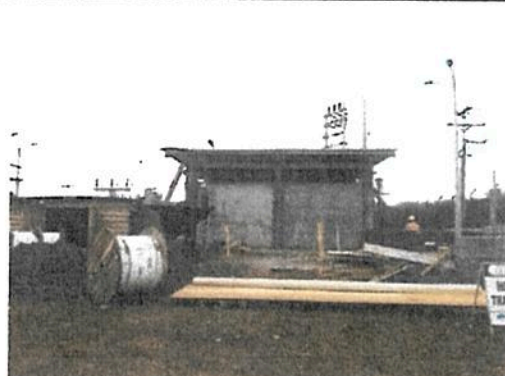


ECTRONICA



ASUNTO: COLOCACION DE CERAMICA

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

27/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



ELEGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA

No. 80



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: COLOCACIÓN DE MAHPOSTERÍA			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- HERRAMIENTA MENOR	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (4)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		SOLEADO	4 HORAS
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1. COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN EL PISO DEL CUARTO DE CONTROL			
2. COLOCACIÓN DE MAHPOSTERÍA EN EL EJE 9A			
3. ENTREGA DE COMINAS			
4. INICIO DE REPOSICIÓN DE GRAVA (LATERAL DEL CUARTO DE CONTROL)			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
28-04-2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 80



AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐

ASUNTO: COLOCACION DE MAMPOSTERIA EJE 8A,9A

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA





28/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA

 ELEGALAPAGOS	LIBRO DE OBRA No. 81 <small>"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"</small>	
CONTRATO N° 005-2017		
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>
ASUNTO: EMPOLADA DE CERAMICA		
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1)		1.- HERRAMIENTA MENOR
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-
3.-Maestro mayor (1)		3.-
4.-Obreros (3)		4.-
5.-		5.-
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS
1.-		SOLEANDO
2.-		
3.-		
		HORAS TRABAJADAS
		8 HORAS
ACTIVIDADES REALIZADAS:		
1. EMPOLADA DE CERAMICA EN EL PISO DEL CUARTO DE CONTROL		
2. REPOSICIÓN DE GRAVA EN EL PATIO DE TRANSFORMADOR		
3. ENVOLCADO DE VIGAS		
4. COLOCACIÓN DE MAHPOSTERÍA EN EL EJE 9 B.		
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:		
1.-		
2.-		
3.-		
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:		
1.-		
2.-		
3.-		
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
30-04-2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 81



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

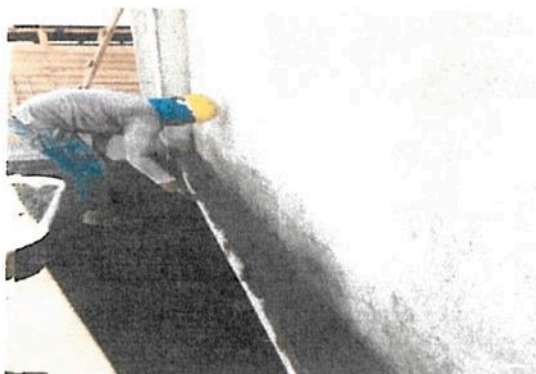
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ECTRONICA ☐





ASUNTO: EMPORADA DE CERAMICA

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
29/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA

	LIBRO DE OBRA No. 82.	
"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"		
CONTRATO N° 005-2017		
CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.	CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS	CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: ESTUCADO DE PARED.		
PERSONAL UTILIZADO	EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)	1.- HERRAMIENTAS MENORES	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)	2.-	
3.-Maestro mayor (1)	3.-	
4.-Obreros 4	4.-	
5.-	5.-	
VISITANTES	CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-	SOLEADO	8 HORAS
2.-		
3.-		
ACTIVIDADES REALIZADAS:		
1.- COLOCACIÓN DE MAHPOSTERIA EN EL EJE 8C 9C		
2.- ESTUCADO INTERIOR EN EL CUARTO DE CONTROL		
3.- ESTUCADO EXTERIOR EN EL CUARTO DE CONTROL		
4.- REPOSICIÓN DE GRAVA EN EL PATIO DE TRANSFORMADORES		
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:		
1.-		
2.-		
3.-		
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:		
1.-		
2.-		
3.-		
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
01-05-2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 82



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

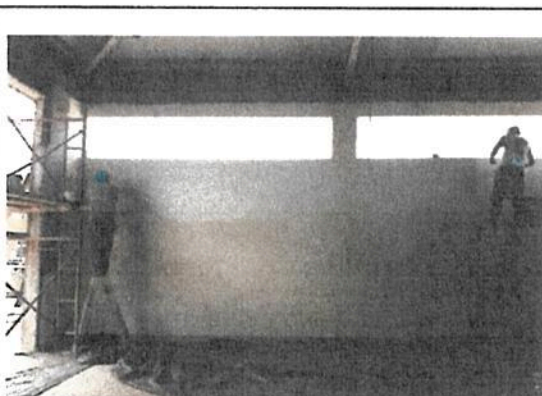
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: ESTUCADO DE PARED

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELECGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
01/05/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wensang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 83



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: FUNDICION DE TAPAS.

PERSONAL UTILIZADO

- 1.-Residente de obra (1)
- 2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)
- 3.-Maestro mayor (1)
- 4.-Obreros 4
- 5.-

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

- 1.- HERRAMIENTA MENOR
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-

VISITANTES

- 1.- ING FERNANDO JITERI
- 2.-
- 3.-

CONDICIONES CLIMATICAS

SOLEADO

HORAS TRABAJADAS

8 HORAS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1 FUNDICION DE 4 MARCOS METALICOS PARA TAPAS EN DUCTERIA

2. FUNDICION DE 9 TAPAS PARA BANCO DE DUCTOS

3. AJUSTO DE PARED INTERIOR Y EXTERIOR EN EL CUARTO DE CONTROL

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

02-05-2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 83



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: FUNDICION DE TAPAS DE DUCTERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
02/05/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 84

"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"



CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: PINTURA DEL CUARTO DE CONTROL

PERSONAL UTILIZADO

- 1.-Residente de obra (1)
- 2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)
- 3.-Maestro mayor (1)
- 4.-Obreros (4)
- 5.-

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-

VISITANTES

- 1.- Ing. Jimmy Zambrano
- 2.-
- 3.-

CONDICIONES CLIMATICAS

SOLEADO

HORAS TRABAJADAS

8 HORAS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 1.- SELLADO DE PARED INTERIOR Y EXTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL
- 2.- CUBIERTA DE TAPAS EN LOS BANCO DE DUCTOS
- 3.- CUBIERTA DE CANALIZACION EN LA CUBIERTA DE CUARTO DE CONTROL
- 4.- PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

Lugar y Fecha

03 05 2018

Por ELEGALAPAGOS S.A.

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

Por el CONTRATISTA

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 84



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

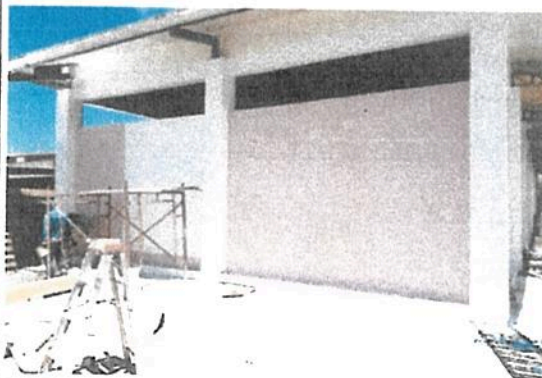
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: PINTURA DEL CUARTO DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

03/05/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 85



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: <i>Revisión de Boletín</i>			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- <i>Herramientas Manuales</i>	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros <i>4</i>		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.- <i>Ing. JIMAY ZALAYANO</i>		<i>Nuboso</i>	<i>8 Horas</i>
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1. <i>Revisión de Boletines de Agua Nueva</i>			
2. <i>Revisión de Boletines</i>			
3. <i>Revisión de Boletines junto al equipo de control.</i>			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
<i>04-05-2018</i>	<i>[Firma]</i> NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	<i>[Firma]</i> NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 85



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS



CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: REPOSICION Y PINTURA DE BORDILLOS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
04/05/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 86



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ☒ ELECTRICA ☐ ELECTRONICA ☐

ASUNTO: LIMPIEZA GENERAL

PERSONAL UTILIZADO

- 1.-Residente de obra (1)
- 2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)
- 3.-Maestro mayor (1)
- 4.-Obreros
- 5.-

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

- 1.- HERRAMIENTA MENOR
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-

VISITANTES

- 1.-
- 2.-
- 3.-

CONDICIONES CLIMATICAS

Soleando

HORAS TRABAJADAS

4 Horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO DE CONTROL

2. DESARROLLO DE MATERIAL

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

Lugar y Fecha

05-05-2018

Por ELEGALAPAGOS S.A.

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

Por el CONTRATISTA

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 86



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



ELECTRICA

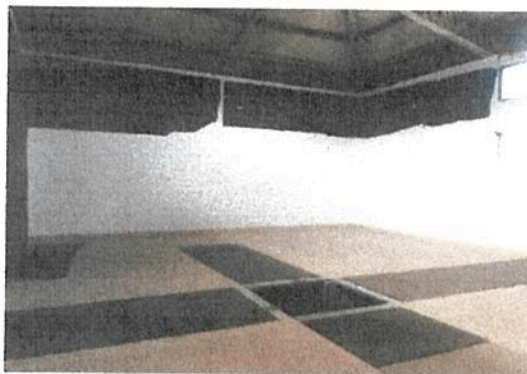


ELECTRONICA



ASUNTO: LIMPIEZA GENERAL CUARTO DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

05/05/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA
