




LIBRO DE OBRA No. 053



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input type="checkbox"/>	LECTRICA <input checked="" type="checkbox"/>
ASUNTO: EXCAVACION MANUAL DE TRINCHERAS INTERNAEN EL CUARTO DE CONTROL			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- Rotomartillo	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (6)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
		Soleado	8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.-Excavacion manual para trincheras interna y externa del cuarto de control.			
2.-Armado de tapas para cajas.			
3.-Rotura de hormigon para trinchera.			
4.-Desalojo de escombros de carpinteria.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
09/02/2018	 NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	

del 1.7



LIBRO DE OBRA No. 053



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

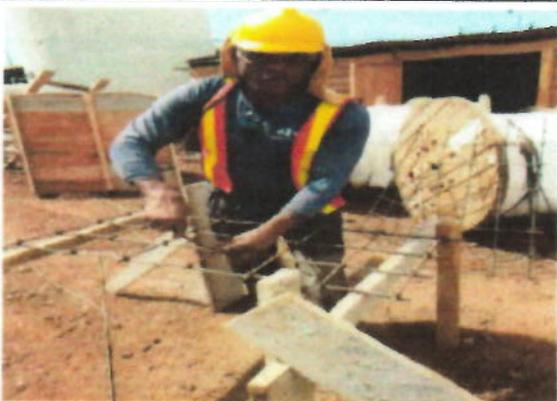
CIVIL

ELECTRICA


ELECTRONICA

ASUNTO: EXCAVACION MANUAL DE TRINCHERAS INTERNAEN EL CUARTO DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
09/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 054



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL ELECTRICA ELECTRONICA

ASUNTO: Fundicion de caja. Union de ductos con trinchera.

PERSONAL UTILIZADO	EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1)	1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)	2.-
3.-Maestro mayor (1)	3.-
4.-Obreros (6)	4.-
5.-	5.-

VISITANTES	CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
	Soleado	4 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 1.-Fundicion de caja. Union de ductos con trinchera.
- 2.-Fundicion de tapas para cajas.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
10/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 054



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017


CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.	CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS	CIVIL <input type="checkbox"/> ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>

ASUNTO: Fundicion de caja. Union de ductos con trinchera.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
10/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 055



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL ELECTRICA ELECTRONICA

ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.

PERSONAL UTILIZADO	EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1)	1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)	2.-
3.-Maestro mayor (1)	3.-
4.-Obreros (6)	4.-
5.-	5.-

VISITANTES	CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
	Soleado	8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 1.-Enlucido en paredes de cuerto de control.
- 2.-Desencofrado de cajas.
3. Movimiento de tierra.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
14/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 055



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



LECTRICA



ECTRONICA



ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
14/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 056



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.	CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS	CIVIL <input type="checkbox"/> ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>

ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.

PERSONAL UTILIZADO	EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1)	1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)	2.-
3.-Maestro mayor (1)	3.-
4.-Obreros (6)	4.-
5.-	5.-

VISITANTES	CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
	Soleado	8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 1.-Enlucido en paredes de cuerto de control.
- 2.-Excavacion de trinchera dentro y fuera de la sala de control.
3. Instalaciones electricas en ampliacion del cuerto de control.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-Las actividades se paralizan debido a los problemas de transporte maritimo para el traslado de material a GALAPAGOS
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
15/02/2018	 NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 056



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



ELECTRICA



ELECTRONICA




ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
15/02/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 057



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL ELECTRICA ELECTRONICA

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

PERSONAL UTILIZADO	EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1)	1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)	2.-
3.-Maestro mayor (1)	3.-
4.-Obreros (4)	4.-
5.-	5.-

VISITANTES	CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
	Soleado	8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 1.-Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.
- 2.-Armado de encofrado para vigas de cubierta. Cuarto de control
3. Instalacion de placas de acero galvanizado de 10mm en cabeza de columnas.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.- Se reinician las actividades de trabajo .
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
03/04/2018	 NOMBRE:Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE:Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 057



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



LECTRICA



ECTRONICA





ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
03/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 058



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

LECTRICA

ECTRONICA

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.-Herramienta menor	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (4)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
		Soleado	8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

2.-Armado de encofrado para vigas de cubierta. Cuarto de control

3. Traslado de celdas y accesorios de puerto a obra.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
04/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 058



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



LECTRICA



ECTRONICA



ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

04/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 59



AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: <i>ARMADO DE ESTRUCTURA DE VIGAS Y ENCOFRADO</i>			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- <i>HERRAMIENTAS MENOR</i>	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.-	
3.-Maestro mayor (1)		3.-	
4.-Obreros (14)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-			
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1. <i>ARMADO DE ESTRUCTURA PARA VIGAS EN LOS EJES 8A-9A, 9B, 8C, 9C</i>			
2. <i>ARMADO DE ENCOFRADO PARA VIGAS EN EL CUARTO DE AMPLIACIÓN</i>			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.		Por el CONTRATISTA
<i>05-04-2018</i>	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR		 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 59



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017


CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
 UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL ELECTRICA ECTRONICA

ASUNTO: *ARMADO DE ESTRUCTURA DE VIGAS Y ENCOFRADO*

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
05/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Weising RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 60



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO Nº 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ELECTRICA ELECTRONICA

ASUNTO: *ENCOFRADO Y FUNDICIÓN*

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.- *HERRAMIENTAS MENOR*

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

2.- *CONCRETA*

3.-Maestro mayor (1)

3.- *VIBRADOR*

4.-Obreros (4)

4.-

5.-

5.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

1.-

SOLEADO

8 H

2.-

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.. ARMADO DE ESTRUCTURA DE TRINCHERA TIPO B4 (UNDO EXTERIOR)

2.. ENCOFRADO DE VIGAS PARA CUBIERTA EN LOS EJES 8-9A; 9B, 8C y 9C

3.. FUNDICIÓN DE VIGAS EN LOS EJES 8A-9A; 9B; 8C-9C

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

06-04-2018

NOMBRE: Ing. José Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. José Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 60



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
 UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL ELECTRICA ELECTRONICA

ASUNTO: *ENCOFRADO y FUNDICIÓN*

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
06/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wording RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 61



AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL ELECTRICA ECTRONICA

ASUNTO: *ARMADO DE ESTRUCTURA PARA TRINCHERA*

PERSONAL UTILIZADO	EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.- Residente de obra (1)	1.- <i>HERRMIENTA MENOR</i>
2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)	2.-
3.- Maestro mayor (1)	3.-
4.- Obreros (<i>14</i>)	4.-
5.-	5.-

VISITANTES	CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-	<i>SOLEADO</i>	<i>4 HORAS</i>
2.-		
3.-		

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- ARMADO DE ESTRUCTURA DE TRINCHERA TIPO B4 (LADO EXTERIOR)

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
<i>07-04-2018</i>	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 61



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ELECTRICA ELECTRONICA

ASUNTO: *ARMADO DE ESTRUCTURAS PARA TANQUERA*

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
07/04/2018	<p><i>[Signature]</i> NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR</p>	<p><i>[Signature]</i> NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA</p>



LIBRO DE OBRA

No. 62



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO Nº 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ELECTRICA ELECTRONICA

ASUNTO: *ARMADO DE ESTRUCTURAS Y DEMOLICIÓN*

PERSONAL UTILIZADO	EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.- Residente de obra (1)	1.-	<i>HERRAMIENTA MENOR</i>
2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)	2.-	<i>RETRO EXCAVADORA</i>
3.- Maestro mayor (1)	3.-	
4.- Obreros (4)	4.-	
5.- <i>OPERADOR (1)</i>	5.-	
VISITANTES	CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-	<i>SOLEADO</i>	<i>8 HORAS</i>
2.-		
3.-		

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. *ARMADO DE ESTRUCTURA PARA TRINCHERA TIPO B4 (LADO EXTERIOR)*
2. *DEMOLICIÓN DE PARED Y COLUMNAS EN EL EJE 8 DEL CUARTO DE CONTROL PARA AMPLIACIÓN.*
3. *ARREGLO DE MALLA DE PUESTA A TIERRA.*
4.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
<i>09-04-2018</i>	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Worsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 62



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ELECTRICA ECTRONICA

ASUNTO: *ARLADO DE ESTRUCTURA Y DEMOLICIÓN*

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
09/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 63



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO Nº 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ELECTRICA ELECTRONICA

ASUNTO: DEMOLICIÓN DE COLUMNAS Y FUNDICIÓN

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.- HERRAMIENTA MENOR

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

2.- RETROEXCALADORA

3.-Maestro mayor (1)

3.- CONCRETERA

4.-Obreros (4)

4.- VIBRADOR

5.- OPERADOR (1)

5.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

1.-

SOLEADO

8 HORAS

2.-

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- DEMOLICIÓN DE PARED, COLUMNA, VIGAS EN EL EJE 8 PARA AMPLIACIÓN DEL CUARTO DE CONTROL.

2.- FUNDICIÓN DE PISO DE TRINCHERA TIPO B4 LADO EXTERIOR

3.- DESAROSO DE ESCOMBROS DE LA DEMOLICIÓN DE PAREDE Y COLUMNAS DEL CUARTO DE CONTROL.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.- SE REALIZA LA TOMA DE CILINDROS PARA SUS RESPECTIVOS ENSAYO DE RPTURAS

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

10-04-2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 63



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL

ELECTRICA

ELECTRONICA

ASUNTO: *DETALLACIÓN DE COLUMNAS Y FUNDICIÓN*

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
10/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 64



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input type="checkbox"/>	ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/>
ASUNTO: ENCOFRADO DE TRINCHERA			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.- Residente de obra (1)		1.- HERRAMIENTA MENOR	
2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- RETROEXCAVADORA	
3.- Maestro mayor (1)		3.-	
4.- Obreros (4)		4.-	
5.- OPERADOR (1)		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.- ING. KEVIN CRUZ		SOLEADO	8 HORAS
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.- ENCOFRADO PARA FUNDICIÓN DE MUROS DE LA TRINCHERA TIPO B4 (LADO EXTERIOR)			
2.- EXCAVACIÓN DE UN TRAMO DE TRINCHERA EN EL INTERIOR DEL CUARTO DE CONTADOR.			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
11-04-2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 64



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ELECTRICA ECTRONICA

ASUNTO: ENCOFRADO DE TRINCHERA

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
11/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 65



AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input type="checkbox"/>	ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/>
ELECTRONICA <input type="checkbox"/>			
ASUNTO: <i>FUNDICIÓN DE MUROS</i>			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.- Residente de obra (1)		1.- <i>HERMISITAS MENOR</i>	
2.- Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- <i>CONCRETERA</i>	
3.- Maestro mayor (1)		3.- <i>VIBRADOR</i>	
4.- Obreros (<i>14</i>)		4.-	
5.-		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		<i>SOLEADO</i>	<i>8 Horas</i>
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.- <i>FUNDICIÓN DE MURO DE TRINCHERA TIPO B4 LADO EXTERIOR</i>			
2.- <i>FUNDICIÓN DE REPLANTILLO EN EL INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL.</i>			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.-			
2.-			
3.-			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
<i>12-04-2018</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	NOMBRE: Ing. Jose Wonsing RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA No. 65



AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL



ELECTRICA



ECTRONICA

ASUNTO: *Fundición de Muros*

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

12/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 66



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO Nº 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.		CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.	
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS		CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: <i>DESENCOFRADO Y ARMADO DE ESTRUCTURA</i>			
PERSONAL UTILIZADO		EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)		1.- <i>HERRAMIENTA MENOR</i>	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)		2.- <i>SOLDADORA</i>	
3.-Maestro mayor (1)		3.- <i>CORTADORA METAL</i>	
4.-Obreros (4)		4.- <i>TALADRO</i>	
5.- <i>SOLDADOR (1)</i>		5.-	
VISITANTES		CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-		<i>SOLEADO</i>	<i>8</i>
2.-			
3.-			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1.- <i>DESENCOFRADO DE MUROS FONDIDOS DE TRINCHERA TIPO B4 (USO EXTERIOR)</i>			
2.- <i>ARMADO DE ESTRUCTURA PARA TRINCHERA TIPO B4 (INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL)</i>			
3.- <i>FABRICACIÓN DE ANCLAJES PARA TABAS DE LA TRINCHERA (INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL)</i>			
4.- <i>INICIO DE DESMONTAJE DE CUBIERTA DEL CUARTO DE CONTROL.</i>			
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:			
1.-			
2.-			
3.-			
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:			
1.- <i>REVISAR LA ENTREGA DE ANÁLISIS DE PRECIOS DE RUBROS DE O.C.</i>			
2.- <i>REVISAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</i>			
3.- <i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y POSTO DE CERRAJE.</i>			
Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA	
<i>13-04-2018</i>	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Womara RESIDENTE DE OBRA	



LIBRO DE OBRA

No. 66



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS


CIVIL ELECTRICA ECTRONICA

ASUNTO: *DEBENCOFRADO Y ARMADO DE ESTRUCTURA*

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
13/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 67



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

Civil ELECTRICA ELECTRONICA

ASUNTO: *FUNDICIÓN DE PISO DE TRINCHERAS*

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.- *HERRAMIENTA MENDE*

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

2.- *CONCRETERA*

3.-Maestro mayor (1)

3.- *VIBRADOR*

4.-Obreros (4)

4.- *TALADRO*

5.-

5.- *SOLDADORA*

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS

HORAS TRABAJADAS

1.-

SOLEADO

8

2.-

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- *ARMADO DE ESTRUCTURA PARA TRINCHERA INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL*

2.- *FUNDICIÓN DE PISO DE TRINCHERA INTERIOR DEL CUARTO DE CONTROL*

3.- *FINALIZACIÓN DE DESMONTAJE DE CUBIERTA DEL CUARTO DE CONTROL.*

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.- *SE DEBE SACAR CILINDROS DE HORTIGON PARA EL CASO*

2.- *YO DE ROSAS TENCIA*

3.-

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

14-04-2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Vilasquez

RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No.



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

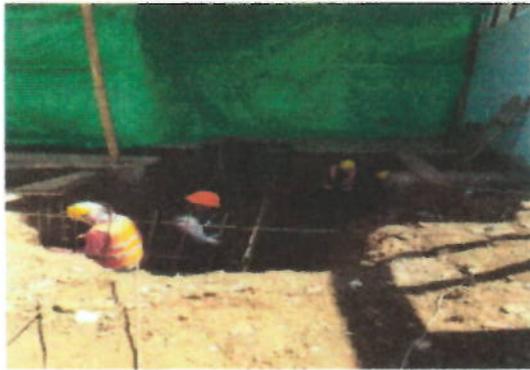
CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS


CIVIL ELECTRICA ECTRONICA

ASUNTO: *FUNDICIÓN DE PISO DE TRINCHERA*

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
14/04/2018	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA

No. 68



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.	CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS	CIVIL <input type="checkbox"/> ELECTRICA <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/>

ASUNTO: *ENCOFRADO DE TRINCHERA, DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA*

PERSONAL UTILIZADO	EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO	
1.-Residente de obra (1)	1.- <i>HERRAMIENTA MENOR</i>	
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)	2.-	
3.-Maestro mayor (1)	3.-	
4.-Obreros (<i>11</i>)	4.-	
5.-	5.-	
6.-	6.-	
VISITANTES	CONDICIONES CLIMATICAS	HORAS TRABAJADAS
1.-	<i>SOLEADO</i>	<i>5 HORAS</i>
2.-		
3.-		

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 1.- *ARMADO DE ENCOFRADO DE TRINCHERA INTERNAS EN EL CUARTO DE CONTROL.*
- 2.- *DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DEL CUARTO DE CONTROL.*

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

- 1.-
- 2.-
- 3.-

Lugar y Fecha	Por ELEGALAPAGOS S.A.	Por el CONTRATISTA
<i>15-04-2018</i>	 NOMBRE: Ing. Jose Castro FISCALIZADOR	 NOMBRE: Ing. Jose Wonsang RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA No. 68



"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELEGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACIÓN: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL ELECTRICA ELECTRONICA

ASUNTO: ENCOFRADO DE TRINCHERA Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:



OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELEGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

15/04/2018

NOMBRE: Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

NOMBRE: Ing. Jose Wonsang
RESIDENTE DE OBRA
